

CLRA/2022/9 del 23 novembre 2022

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.a. - Programma Operativo
Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

IL COORDINATORE

F.to Valentina Palli

CLRA/2022/9

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

L'anno **2022** il giorno **23** del mese di **novembre** alle ore **09:30** si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna convocato con lettera prot. PG.AT/2022/0011483 del 15/11/2022.

La seduta si è svolta in modalità telematica.

Assume la presidenza la Coordinatrice Valentina Palli

Risultano presenti all'appello:

Comune/Provincia	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
Provincia di Ravenna	Palli Valentina	Sindaco Delegato	si	10,000
Alfonsine				2,919
Bagnacavallo	Zanelli Alfeo	Assessore	si	3,931
Bagnara di Romagna				1,005
Brisighella				2,012
Casola Valsenio				1,032
Castel Bolognese				2,509
Cervia	Mazzolani Enrico	Assessore	si	6,550
Conselice	Fabbri Gianfranco	Vicesindaco	si	2,487
Cotignola	Baldini Pier Luca	Vicesindaco	si	2,046
Faenza	Ortolani Luca	Assessore	si	12,892
Fusignano				2,185
Lugo	Galletti Maria Pia	Assessore	si	7,198
Massa Lombarda	Sangiorgi Stefano	Assessore	si	2,715
Ravenna	Baroncini Gianandrea	Assessore	si	33,252
Riolo Terme			si	1,706
Russi	Palli Valentina	Sindaco	si	3,039
Sant'Agata sul Santerno				1,100
Solarolo	Briccolani Stefano	Sindaco	si	1,425

Presenti n. 12 quote 87,2393 - Assenti n. 7 quote 12,7607

Riconosciuta la validità della seduta Valentina Palli, in qualità di Coordinatrice assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al



servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.1 del 27 gennaio 2020 del Consiglio locale di Ravenna è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'Ambito;
- con deliberazione n.86 del Consiglio d'Ambito del 21 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A.;
- con deliberazione n.18 del Consiglio d'Ambito del 7 giugno 2021 è stato approvato l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A. di cui alla deliberazione CAMB n. 86/2020, e approvazione della connessa istanza di proroga delle attuali concessioni del Servizio Idrico Integrato di durata quinquennale nei medesimi territori;
- con nota PG.AT/2021/0002526 del 03/03/2021 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di ATERSIR il nulla osta di ATERSIR ai sensi della deliberazione di Consiglio d'Ambito n.75/2017, per "Modifica del Soggetto finanziatore" (Caso E) relativo all'intervento 2021RAHA0001 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MAZZARI-SOLLEVAMENTO V. GIARDINO in comune di Sant'Agata sul Santerno;

- con nota PG.AT/2021/0003973 del 26/04/2021 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di ATERSIR il nulla osta di ATERSIR ai sensi della deliberazione di Consiglio d'Ambito n.75/2017, per "Variante progettuale che determina un aumento dell'importo progettuale complessivo superiore a 200.000 € rispetto a quello già previsto nel POI vigente" (Caso D) relativo ai tre interventi: 2014RAHA0071 - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LUGO E LINEA DI PIOGGIA in comune di Lugo; 2015RAHA0014 - REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURATORE DI LUGO in comune di Lugo; 2014RAHA0120 - COMPLETAMENTO CONDOTTA IDRICA RAVENNA NORDCASALBORSETTI in comune di Ravenna;
- con nota PG.AT/2021/0004450 del 12/05/2021 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di ATERSIR il nulla osta di ATERSIR ai sensi della deliberazione di Consiglio d'Ambito n.75/2017, per "Interventi di manutenzione straordinaria derivante da criticità segnalate dalle Amministrazioni comunali (Caso C)" relativi agli interventi: 2021RAHA0002 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI in comune di Lugo; 2021RAHA0003 - RICOSTRUZIONE E SPOSTAMENTO FOGNATURA MISTA V.ROMA in comune di Conselice;
- con deliberazione n.8 del 25 luglio 2022 del Consiglio locale di Ravenna è stata approvata la revisione del Programma Operativo degli Interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A., per le sole annualità 2022 e 2023;

considerato inoltre che:

- con deliberazione n. del 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato": modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017";
- la deliberazione n. 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore HERA S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata a tutti i comuni del bacino provinciale di Ravenna, in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all'annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

rilevato inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano complessivamente pari a 21.353.486,07 €, valore inferiore di circa il 12% rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2021;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti a favore unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 dal gestore HERA S.p.a. e relativi al bacino tariffario di Ravenna, come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 9 del 23 novembre 2022

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

La Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 23 novembre 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO
2021**

**GESTORE: HERA S.p.A.
BACINO PROVINCIALE DI RAVENNA**

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 01 del 27/01/2020 (oggetto di successiva revisione straordinaria per le sole annualità 2022 e 2023 con deliberazione di Consiglio Locale di Ravenna n.8 del 25/07/2022), che il gestore HERA S.p.A. ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
GESTORE	14.152.400,00	17.786.604,92	3.634.204,92	26%
SOCIETÀTERZE	6.911.000,00	1.843.361,58	-5.067.638,42	-73%
FINANZIAMENTI PUBBLICI	3.306.000,00	1.723.519,57	-1.582.480,43	-48%
TOTALE	24.369.400,00	21.353.486,07	-3.015.913,93	-12%

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021 (esclusi gli investimenti di struttura)

Per quanto riguarda il riconoscimento tariffario degli investimenti di struttura si rimanda alle *Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa* approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il Gestore HERA S.p.A. abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa un 26% con riferimento a quelli direttamente finanziati, e minori per circa un 73% con riferimento a quelli finanziati da altro soggetto investitore (Società degli assets). Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è minore di quello pianificato di un 48%. Complessivamente lo scostamento è stato del 12% in diminuzione.

La percentuale di investimenti realizzati, esclusi gli investimenti di struttura, è pertanto dell'88%.

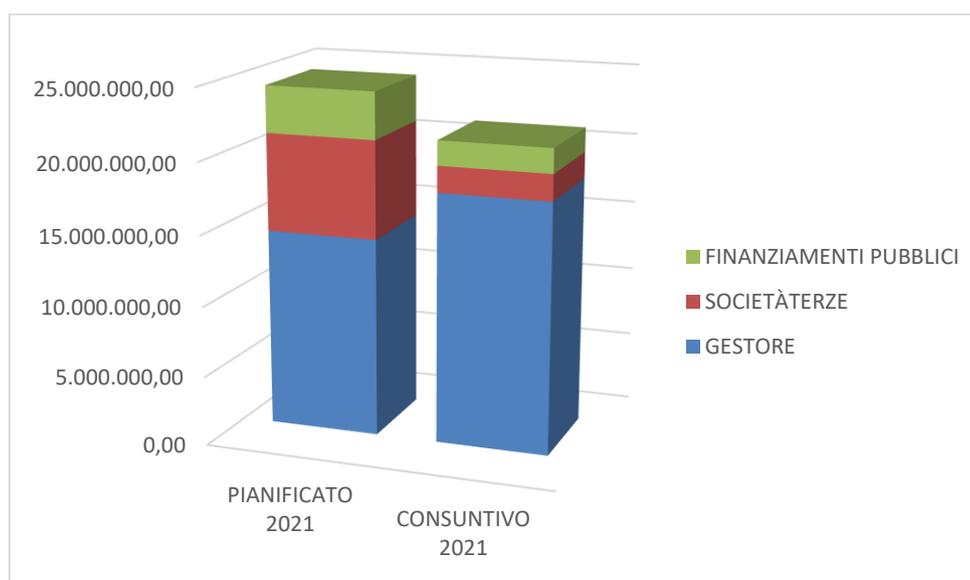


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	9.154.000,00	8.602.844,67	-551.155,33	-6%
DEPURAZIONE	6.545.000,00	4.396.354,11	-2.148.645,89	-33%
FOGNATURA	8.295.400,00	7.832.383,30	-463.016,70	-6%
ACQUE METEORICHE	375.000,00	521.903,99	146.903,99	39%
TOTALE	24.369.400,00	21.353.486,07	-3.015.913,93	-12%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per servizio e rappresentati graficamente come segue:

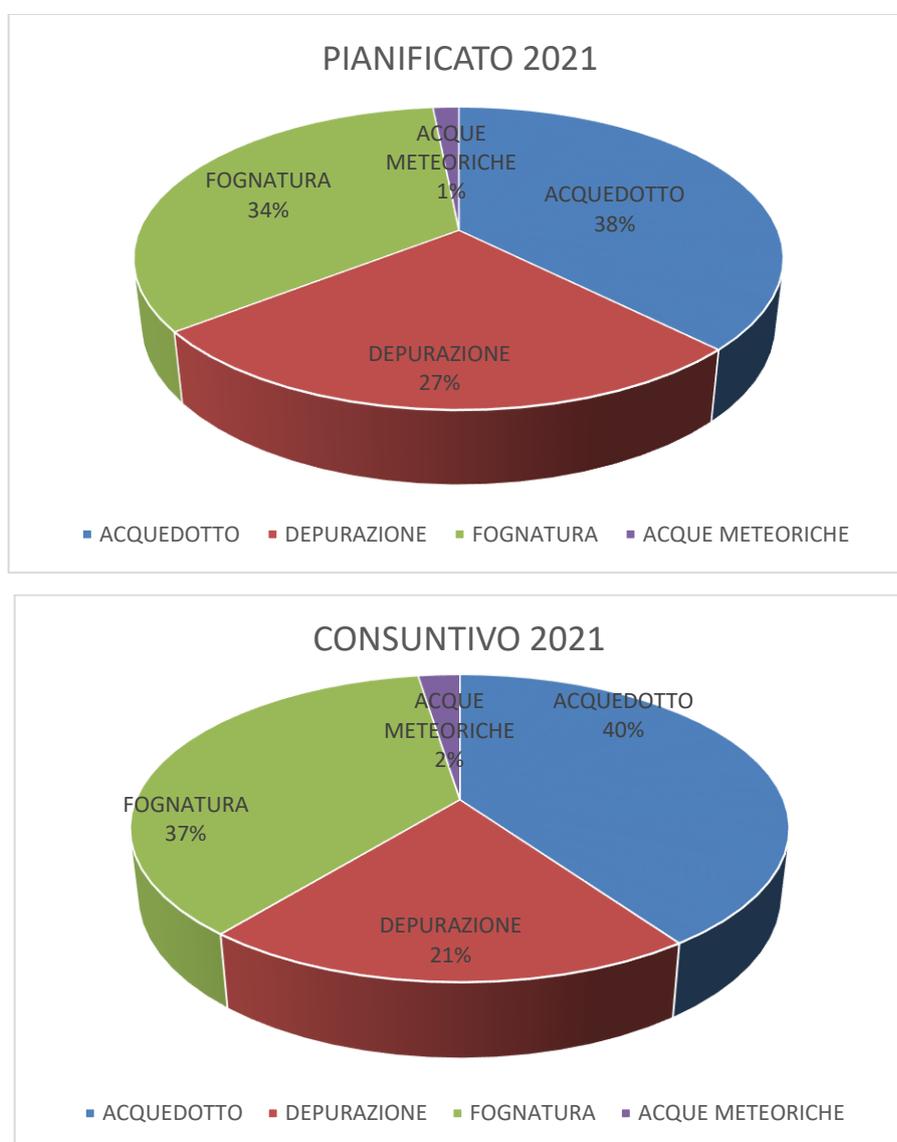


FIG.2 –Suddivisione per servizio investimenti pianificati e consuntivati 2021

La tabella successiva fornisce un focus degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie di acquedotto, fognatura e depurazione contenute in titoli cumulativi.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	6.690.000,00	8.030.042,64	1.340.042,64	20%
DEPURAZIONE	1.250.000,00	1.982.153,31	732.153,31	59%
FOGNATURA	1.790.000,00	2.607.264,00	817.264,00	46%
ACQUE METEORICHE	375.000,00	521.903,99	146.903,99	39%
TOTALE	10.105.000,00	13.141.363,94	3.036.363,94	30%

TAB.3 – Investimenti relativi ai titoli cumulativi delle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito dagli interventi di manutenzione straordinaria contenuti in titoli cumulativi. Per questi titoli è previsto un budget complessivo a cui il Gestore associa i micro-interventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

Confrontando i dati della TAB.3 con quelli della TAB.2 si deduce che l'incidenza dei titoli cumulativi nell'anno 2021, era il 41% del valore totale pianificato e si accresce fino al 62% del valore totale consuntivato.

Si riportano di seguito gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

IMPORTO	N.	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	74	3.425.400,00	1.456.827,67	-1.968.572,33	-57%
501.000-1.000.000 €	33	1.585.000,00	1.078.111,20	-506.888,80	-32%
1.000.001-2.000.000 €	17	2.629.000,00	1.102.203,73	-1.526.796,27	-58%
2.000.001-5.000.000 €	22	1.483.000,00	11.744,18	-1.471.255,82	-99%
Oltre 5.000.000 €	7	5.524.000,00	4.687.633,49	-836.366,51	-15%
Interventi cumulativi	23	9.723.000,00	13.016.965,80	3.293.965,80	34%
TOTALE	176	24.369.400,00	21.353.486,07	3.015.913,93	-12%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

In ultimo viene effettuata un'analisi degli scostamenti tra quanto il Gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato.

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- ritardi accumulati per il prolungamento delle attività autorizzative o approfondimenti tecnici
- riprogrammazione di attività
- flusso di fatturazione alle Società degli Asset
- accordo di finanziamento non ancora sottoscritto
- minori/maggiori esigenze di manutenzione straordinaria a riguardo dei titoli cumulativi, i quali hanno una pianificazione annuale di massima
- interventi stralciati/sostituiti

Il numero di interventi a piano, esclusi i 2 interventi di struttura, è pari a 176.

Il numero di interventi con un importo pianificato nel 2021 è pari a 96. Il numero di interventi con un importo rendicontato nel 2021 è pari a 57.

Ci sono inoltre 74 interventi presenti a piano nell'annualità 2021 con importo pianificato pari a 0 e importo rendicontato pari a 0.

	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%), cd "non avviati"	45	6.357.000,00	0,00
Interventi con un valore pianificato pari a 0 e un valore consuntivato diverso da 0 (+100%)	6	0,00	418.730,07
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	42	13.152.400,00	15.783.422,28
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	9	4.860.000,00	5.151.333,72
TOTALE	102	24.369.400,00	21.353.486,07

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal Gestore

Si può notare come i minori importi consuntivati sono dovuti principalmente agli interventi così detti "non avviati", cioè con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0. Possono essere, ad esempio, interventi non iniziati, annullati, sospesi, con accordo di finanziamento non ancora sottoscritto, etc... Per maggiori dettagli si rimanda alle note giustificative del Gestore.

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono ritenute esaustive e sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

3. INTERVENTI “NON AVVIATI”

Si riporta l'elenco degli interventi “non avviati”, che presentano un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (inseriti convenzionalmente con scostamento pari a -100%).

Possono essere, ad esempio, interventi non iniziati, annullati, sospesi, con accordo di finanziamento non ancora sottoscritto. Per maggiori dettagli si rimanda alle note giustificative contenute nell'allegato 1.

	Codice	Titolo	Servi- zio	Comune	Tipo Investimento	Importo lordo pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021
1	2014RAHA0001	Depuratore Alfonsine: automazione per adeg. lim. azoto	D	Alfonsine	Gestore	150.000,00	-
2	2019RAHA0010	Adeguamento dell'agglomerato di Villa Vezzano	F	Brisighella	Con.ami	300.000,00	-
3	2019RAHA0014	Estensione rete acquedotto da Chiesuola a Monte Battaglia nella parte alta delle valle del Cestina per 18 - 20 utenze	A	Casola Valsenio	Gestore	220.000,00	-
4	2019RAHA0015	Estensione rete acquedotto nell'alta valle del rio Sintria per 10 utenze	A	Casola Valsenio	Gestore	110.000,00	-
5	2019RAHA0013	Realizzazione collettore scarico potabilizzatore di Casola	A	Casola Valsenio	Con.ami	62.000,00	-
6	2019RAHA0017	Intervento per la riduzione degli scarichi dello scolmatore v. Canale	F	Castel Bolognese	Con.ami	27.000,00	-
7	2019RAHA0016	Adeguamento sismico pensile Castelbolognese	A	Castel Bolognese	Con.ami	362.000,00	-
8	2015RAHA0006	Potenziamento rete idrica Milano Marittima	A	Cervia	Gestore	50.000,00	-
9	2019RAHA0018	Adeguamento sismico pensile Cervia	A	Cervia	Soc. Asset non definitiva	18.000,00	-
10	2019RAHA0023	Lavezzola - separazione fogne nere zona industriale	F	Conselice	Con.ami	237.000,00	-
11	2019RAHA0024	Adeguamento sismico pensile Cotignola	A	Cotignola	Soc. Asset non definitiva	18.000,00	-
12	2019RAHA0028	Adeguamento del depuratore di Faenza	D	Faenza	Con.ami	41.000,00	-
13	2014RAHA0063	Collettamento depurazione quart. via da Pozzo via Biasola	F	Faenza	Romagna Acque	49.000,00	-
14	2019RAHA0029	Ottimizzazione sistema fognario Faenza	F	Faenza	Gestore	75.000,00	-

	Codice	Titolo	Servi- zio	Comune	Tipo Investimento	Importo lordo pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021
15	2015RAHA0011	Realizzazione vasca di prima pioggia sollevamento Bambole	F	Faenza	Romagna Acque	76.000,00	-
16	2015RAHA0010	Interventi per riduzione carichi scolmatore via Boaria	F	Faenza	Soc. Asset non definita	73.000,00	-
17	2019RAHA0026	Collegamento e sistema di pompaggio Faenza-Brisighella	A	Faenza	Con.ami	18.000,00	-
18	2019RAHA0030	Revamping digestori e gasometro depuratore di Lugo	D	Lugo	Team	60.000,00	-
19	2015RAHA0014	Realizzazione vasca di prima pioggia depuratore di Lugo	D	Lugo	Romagna Acque	261.000,00	-
20	2014RAHA0067	Potenziamento rete idrica Lugo - Voltana	A	Lugo	Gestore	20.000,00	-
21	2021RAHA0002	Risanamento e adeguamento sistema fognario v. Goldoni	F	Lugo	Gestore	10.000,00	-
22	2015RAHA0024	Verifiche e adeguamenti sismici impianti acquedotto – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	175.000,00	-
23	2018RAHA0016	Manutenzione straord. Impianti acq. Industriale	A	Opere Pluricomunali	Gestore	10.000,00	-
24	2018RAHA0017	Rinnovo reti acq. Industriale	A	Opere Pluricomunali	Gestore	40.000,00	-
25	2019RAHA0036	Interferenze sotto servizi acquedotto con rete autostradale – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	10.000,00	-
26	2019RAHA0039	Interferenze sotto servizi fognatura con rete autostradale – RA – ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	10.000,00	-
27	2014RAHA0101	Sistema approvvigionamento idrico Castelvolognese - Con.ami	A	Opere Pluricomunali	Con.ami	1.070.000,00	-
28	2019RAHA0056	Tombamento fosso v. Cella san Bartolo	F	Ravenna	Ravenna Holding	517.000,00	-
29	2019RAHA0041	Potenziamento centrale idrica Lido Adriano	A	Ravenna	Ravenna Holding	23.000,00	-
30	2018RAHA0004	Raccolta acque prima pioggia - Il stralcio	F	Ravenna	Gestore	101.000,00	-
31	2015RAHA0026	Interventi per riduzione carichi scolmatori - sollevamento Bidente	F	Ravenna	Soc. Asset non definita	107.000,00	-
32	2019RAHA0043	Nuovo impianto caditoie a depuratore di Ravenna	D	Ravenna	Romagna Acque	46.000,00	-

	Codice	Titolo	Servi- zio	Comune	Tipo Investimento	Importo lordo pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021
33	2014RAHA0120	Compl. cond. idrica Ravenna nord Casalborsetti	A	Ravenna	Romagna Acque	80.000,00	-
34	2019RAHA0053	Completamento della separazione delle reti in località Casalborsetti	F	Ravenna	Romagna Acque	155.000,00	-
35	2018RAHA0002	Potenziamento collettore Porto Corsini-Depuratore	F	Ravenna	Gestore	186.000,00	-
36	2019RAHA0046	Filtrazione e disinfezione depuratore di Ravenna	D	Ravenna	Romagna Acque	182.000,00	-
37	2019RAHA0044	Dismissione depuratore Marina di Ravenna e collettamento a Ravenna	D	Ravenna	Soc. Asset non definita	59.000,00	-
38	2015RAHA0027	Interventi per riduzione carichi scolmatori - sollevamento nord città	F	Ravenna	Soc. Asset non definita	204.000,00	-
39	2019RAHA0047	Darsena città II str. premente via Romea	F	Ravenna	Romagna Acque	176.000,00	-
40	2019RAHA0057	Potenziamento sollevamenti rete nera penisola Trattaroli	F	Ravenna	Romagna Acque	137.000,00	-
41	2019RAHA0054	Ricostruzione premente Porto Corsini	F	Ravenna	Ravenna Holding	145.000,00	-
42	2014RAHA0117	Realizzazione adduttrice "Corso nord" - III stralcio	A	Ravenna	Soc. Asset non definita	93.000,00	-
43	2019RAHA0045	Adeguamento linea fanghi depuratore di Ravenna	D	Ravenna	Romagna Acque	309.000,00	-
44	2018RAHA0014	Depuratore Ravenna: realizzazione nuova linea acque	D	Ravenna	Romagna Acque	255.000,00	-
45	2019RAHA0064	Ricostruzione premente sollevamento Madonna della salute – II stralcio	F	Solarolo	Con.ami	30.000,00	-

	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo progettuale	Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 del 27/01/2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
18	2014RAHA0020	Manutenzione fogn. in v. Emiliani	F	Brisighella	Gestore	180.000,00	-	-	-	-	35.419,56	-	-	35.419,56	35.419,56	100%	Intervento concluso. L' intervento non prevede alcun importo nelle varie annualità di POI per un refuso nell'attività di pianificazione. La realizzazione dell'intervento, avvenuta nel 2020, ha richiesto lavorazioni esclusivamente nelle ore notturne interrompendo l'unica viabilità esistente nel tratto pedemontano. Durante la realizzazione sono emerse ulteriori esigenze manutentive, pertanto nel 2021 sono stati effettuati ulteriori interventi integrativi fuori perimetro
19	2015RAHA0004	Realizzazione collettore scarico potabilizzatore di Casola	A	Casola Valsenio	Gestore	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	2019RAHA0012	Riordino bacini rio Cestina	A	Casola Valsenio	Con.ami	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	2019RAHA0014	Estensione rete acquedotto da Chiesuola a Monte Battaglia nella parte alta delle valle del Cestina per 18 - 20 utenze	A	Casola Valsenio	Gestore	220.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	220.000,00	-100%	Il lavoro in oggetto si configura come una estensione da un acquedotto "rurale" non inserito all' interno del SII. Il lavoro non sarà eseguibile fino all'ottenimento del prerequisite necessario, cioè l'acquisizione dell'acquedotto rurale al patrimonio comunale e la successiva cessione in gestione al Gestore del SII. È in corso la valutazione dello stato dell'acquedotto rurale
22	2019RAHA0011	Manutenzione straordinaria vasca di stoccaggio Casola Valsenio	A	Casola Valsenio	Con.ami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ID stralciato in quanto l'intervento manutentivo non risulta più necessario poiché la criticità è stata risolta tramite altri interventi minori di manutenzione straord. effettuati sull'impianto
23	2015RAHA0005	Adeguamento agglomerato Casola Valsenio	F	Casola Valsenio	Gestore	250.000,00	100.000,00	-	100.000,00	12.983,39	-	-	12.983,39	-	87.016,61	-87%	Intervento concluso. L'agglomerato è stato adeguato regolarizzando alcuni allacci non conformi e scolmatori, e realizzando un piccolo tratto di rete mista. Complessivamente gli importi spesi per questi interventi sono stati notevolmente inferiori all' importo stimato a POI in relazione alle modificate conformazioni ambientali a seguito degli eventi franosi verificatesi. Restano invece escluse le realizzazioni vincolate all'intervento del Comune nell'area sportiva oggetto di frana che verranno gestite all' interno dell'ID della manutenzione reti fognarie
24	2018RAHA0008	Rinnovo rete idrica di distribuzione in acciaio laghi del Cestina – FSC scheda 25	A	Casola Valsenio	Gestore	657.450,00	90.000,00	-	90.000,00	8.271,78	-	-	8.271,78	-	81.728,22	-91%	Intervento in terminata progettazione. Lo scostamento 2021 è conseguente alla già segnalata necessità di attuare modifiche dei tracciati progettuali, come da richieste degli Enti gestori strade. Pertanto l'intervento ha subito una ripianificazione. Avvio lavori previsto a fine 2022
25	2019RAHA0015	Estensione rete acquedotto nell'alta valle del rio Sintria per 10 utenze	A	Casola Valsenio	Gestore	110.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	110.000,00	-100%	Il lavoro in oggetto si configura come una estensione da un acquedotto "rurale" non inserito all' interno del SII. Il lavoro non sarà eseguibile fino all'ottenimento del prerequisite necessario, cioè l'acquisizione dell'acquedotto rurale al patrimonio comunale e la successiva cessione in gestione al Gestore del SII. È in corso la valutazione dello stato dell'acquedotto rurale

	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo progettuale	Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 del 27/01/2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
43	2019RAHA0020	Nuova sedimentazione finale e adeguamento del depuratore di Conselice	D	Conselice	Con.ami	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	2019RAHA0022	Interventi per la riduzione carichi scolmatori di Lavezzola	F	Conselice	Con.ami	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	2019RAHA0021	Interventi per la riduzione carichi scolmatori di Conselice	F	Conselice	Con.ami	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	2017RAHA0017	Potenziamento del depuratore di Lavezzola	D	Conselice	Con.ami	1.032.299,00	240.000,00	-	240.000,00	-	110.910,22	-	110.910,22	-	129.089,78	-54%	Intervento concluso. Scostamento 2021 dovuto alla chiusura del flusso di fatturazione alla Società degli Asset
47	2018RAHA0009	Rinnovo rete idrica di distribuzione in PVC - FSC scheda 26	A	Conselice	Gestore	1.465.200,00	150.000,00	-	150.000,00	255.685,86	-	255.685,86	105.685,86	70%	Scostamento 2021 conseguente al recupero di realizzazioni previste a POI nel 2020. Infatti nel 2020 era stato necessario attuare modifiche dei tracciati progettuali, come da richieste degli Enti gestori strade, con la conseguente ripianificazione dell'esecuzione a partire dal 2021		
48	2021RAHA0003	Ricostruzione e spostamento fognatura mista v. Roma	F	Conselice	Gestore	100.000,00	30.000,00	-	30.000,00	737,47	-	737,47	29.262,53	-98%	Intervento in progettazione. Si è in attesa di ricevere l'autorizzazione a procedere da FFS		
49	2019RAHA0025	Studio sistema fognario di Cotignola finalizzato all'individuazione di eventuali interventi sulla rete fognaria	F	Cotignola	Gestore	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nel corso del 2021 definite le priorità tra i vari studi previsti a POI. Si prevede la conclusione dello studio nel 2022 con la finalità di individuare eventuali criticità strutturali per le quali verranno successivamente definite le competenze di realizzazione e gli interventi risolutivi che, trattandosi di acque meteoriche, potrebbero non essere di competenza del Gestore
50	2019RAHA0024	Adeguamento sismico pensile Cotignola	A	Cotignola	Soc. Asset non definita	466.500,00	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00	-100%	Intervento in sospesa progettazione. Il pensile di Cotignola coincide con il punto di consegna di Romagna Acque. Sono in corso con RASDF interlocuzioni per valutare se sia assolutamente necessario prevedere l'adeguamento o possono essere considerate altre soluzioni impiantistiche		
51	2019RAHA0028	Adeguamento del depuratore di Faenza	D	Faenza	Con.ami	1.356.000,00	41.000,00	-	41.000,00	-	-	-	41.000,00	-100%	Intervento ripianificato in funzione delle priorità ed effettive necessità		
52	2014RAHA0063	Collettamento depurazione quart. via da Pozzo via Biasola	F	Faenza	Romagna Acque	200.000,00	49.000,00	-	49.000,00	-	-	-	49.000,00	-100%	Intervento in progettazione preliminare. Lo scostamento 2021 è dovuto al fatto che, non sussistendo criticità nella gestione del servizio, sono ancora in corso le valutazioni relative all'effettiva esigenza dell'intervento così come definito a POI o alla sua ridefinizione		
53	2014RAHA0055	Estensione rete loc. Reda III lotto - HERA	A	Faenza	Gestore	700.000,00	-	-	-	16.380,38	-	16.380,38	16.380,38	100%	Intervento concluso. Scostamento 2021 legato alle residue attività contabili		
54	2019RAHA0029	Ottimizzazione sistema fognario Faenza	F	Faenza	Gestore	300.000,00	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	75.000,00	-100%	Lo scostamento 2021 è legato al fatto che questo ID presenta una pianificazione omogenea negli anni e raggruppa una serie di interventi puntuali di ottimizzazione la cui definizione viene effettuata sulla base delle esigenze che si manifestano anno per anno		
55	2015RAHA0011	Realizzazione vasca di prima pioggia sollevamento Bambole	F	Faenza	Romagna Acque	-	76.000,00	-	76.000,00	-	-	-	76.000,00	-100%	ID stralciato per cambio di Soggetto Finanziatore da RASDF a HERA. L'intervento è in fase di prog. prel. e verrà rendicontato nel nuovo ID 2022RAHA0020. In linea con le priorità 2A della DGR 201 e relative richieste di proroga.		

							Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 del 27/01/2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
56	2015RAHA0010	Interventi per riduzione carichi scolmatore via Boaria	F	Faenza	Soc. Asset non definita	2.642.000,00	73.000,00	-	73.000,00	-	-	-	-	-	73.000,00	-100%	Scostamento 2021 legato alla ripianificazione delle attività in relazione alle priorità ed alle valutazioni in corso sulla fattibilità della separazione delle reti. Questo intervento si compone di due parti: 1- realizzazione vasca 2-opere per riduzione del carico sullo scolmatore in via Boaria. A valle dello studio eseguito dalla struttura di modellazione è stato necessario rivedere il progetto tenendo conto di ulteriori interventi necessari sulla rete per consentire di rispettare il risultato atteso in termini di riduzione di COD (indicatore di inquinamento idrico) sversato dalla vasca e allo stesso tempo di ridurre leggermente la volumetria della vasca ipotizzata inizialmente
57	2019RAHA0026	Collegamento e sistema di pompaggio Faenza-Brisighella	A	Faenza	Con.ami	3.500.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	-	-	18.000,00	-100%	Scostamento 2021 legato al prolungamento delle valutazioni complessive in merito all'utilizzo delle fonti del territorio
58	2019RAHA0027	Collegamento della rete fognaria della località Borghetto a servizio di depurazione	D	Faenza	Con.ami	480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	2014RAHA0066	Adeguamento rete fognaria v. Cantagallo-Sordina	F	Fusignano	Gestore	501.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Scostamento 2021 legato al prolungarsi della fase autorizzativa, in particolare per la ridefinizione del canale Cantagallo quale vettore fognario (domanda presentata il 22/04/21)
60	2019RAHA0030	Revamping digestori e gasometro depuratore di Lugo	D	Lugo	Team	4.188.346,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00	-100%	Intervento ripianificato in funzione delle priorità ed effettive necessità
61	2019RAHA0031	Razionalizzazione rete fognaria Lugo	F	Lugo	Gestore	400.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	15.664,83	-	-	15.664,83	84.335,17	-84%	Questo ID risulta direttamente dipendente dall'ID 2014RAHA0071. Nel 2020 sono stati realizzati una serie interventi propedeutici all'intervento 2014RAHA0071. Scostamento 2021 legato al fatto che le opere sono vincolate allo stato di avanzamento dei lavori previsti per il depuratore di Lugo. Gli importi 2021 non realizzati sono previsti per il 2022
62	2014RAHA0071	Adeguamento e potenziamento del depuratore di Lugo e linea di pioggia.	D	Lugo	Gestore	5.060.000,00	259.000,00	-	-	259.000,00	104.631,67	-	-	104.631,67	154.368,33	-60%	Scostamento 2021 legato al fatto che data la scarsissima partecipazione alla gara espletata (giugno-ottobre 2021), una risposta così limitata da parte del mercato è risultata non soddisfacente, sia nell'interesse alla concorrenza sia nell'interesse della stazione appaltante e della buona riuscita dell'intervento. Si è pertanto ritenuto opportuno revocare la gara in autotutela e, a valle dell'aggiornamento del progetto esecutivo sia dal punto di vista economico che dei contenuti, ripubblicare il bando in termini più favorevoli ad una partecipazione concorrenziale
63	2015RAHA0012	Manutenzione straordinaria linea 2 del depuratore	D	Lugo	Gestore	1.145.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	2015RAHA0014	Realizzazione vasca di prima pioggia depuratore di Lugo	D	Lugo	Romagna Acque	4.760.000,00	261.000,00	-	261.000,00	-	-	-	-	-	261.000,00	-100%	Intervento in fase di gara e il cui perimetro è stato allargato prevedendo l'inserimento di un intervento fognario che contribuisce all'obiettivo di riduzione dei carichi sversati. Lo scostamento 2021 è legato al fatto che l'accordo attuativo non era stato sottoscritto al 31/12/2021; i costi sostenuti verranno rendicontati nell'anno di sottoscrizione dell'AA

							Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 del 27/01/2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
77	2019RAHA0033	Studio delle criticità della rete fognaria di v. Mameli, v. Marzabotto, v. Montefiorino e v. Marchetti/Saffi	F	Massa Lombarda	Gestore	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nel corso del 2021 definite le priorità tra i vari studi previsti a POI. Si prevede la conclusione dello studio nel 2022 con la finalità di individuare eventuali criticità strutturali per le quali verranno successivamente definite le competenze di realizzazione e gli interventi risolutivi che, trattandosi di acque meteoriche, potrebbero non essere di competenza del Gestore
78	2014RAHA0112	Rilievo reti fognarie – RA – ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	604.239,00	30.000,00	-	-	30.000,00	24.293,15	-	-	24.293,15	- 5.706,85	-19%	
79	2014RAHA0094	Ripr. asfalti rete idrica – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	450.000,00	-	-	450.000,00	446.174,43	-	-	446.174,43	- 3.825,57	-1%	
80	2018RAHA0012	Impianti di sollevamento, vasche di laminazione, vasche di prima pioggia	AB	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	175.000,00	-	-	175.000,00	153.611,30	-	-	153.611,30	- 21.388,70	-12%	
81	2018RAHA0010	Investimenti di struttura	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	1.799.721,00	-	-	1.799.721,00	-	-	-	- 1.799.721,00	-100%	Da verificare separatamente	
82	2014RAHA0093	Rinnovo reti/allacci acqua da PI – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	2.643.666,86	-	-	2.643.666,86	1.143.666,86	76%	Maggiori esigenze di manutenzione straord. su reti e allacci acquedotto conseguenti a segnalazioni di pronto intervento
83	2014RAHA0173	Sost. Ctr. pari calibro – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	964.097,29	-	-	964.097,29	- 135.902,71	-12%	
84	2019RAHA0035	Nuovi allacci/estensioni reti/impianti di utenza c/to cliente acquedotto – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	1.364.685,90	1.440.098,07	-	75.412,17	214.685,90	19%	
85	2015RAHA0024	Verifiche e adeguamenti sismici impianti acquedotto – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.700.000,00	175.000,00	-	-	175.000,00	-	-	-	- 175.000,00	-100%	ID di natura ricorsiva che comprende l'adeguamento sismico degli edifici degli impianti acquedotto di ATO7. Gli importi pianificati sono di larga massima e la realizzazione temporale degli interventi è legata all'esito delle verifiche sugli edifici da adeguare. Nel corso del 2021 non sono stati individuati interventi specifici da avviare	
86	2015RAHA0018	Adeguamento sicurezza impianti depurazione – RA – ATO7	D	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	80.000,00	-	-	80.000,00	163.007,57	-	-	163.007,57	83.007,57	104%	Maggiori esigenze di adeguamenti alla sicurezza rispetto alla pianificazione
87	2014RAHA0106	Rinnovo reti fogn. Programmato – RA – ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	510.000,00	-	-	510.000,00	615.922,51	-	-	615.922,51	105.922,51	21%	Maggiori esigenze di manutenzione straord. reti fognarie rispetto alla pianificazione
88	2018RAHA0016	Manutenzione straord. Impianti acq. Industriale	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	- 10.000,00	-100%	Scostamento legato al fatto che questo ID cumulativo, in ottica di semplificazione, è stato chiuso in quanto tutte le attività di manutenzione degli impianti acquedotto, compreso l'ex acquedotto industriale, sono state rendicontate a partire dal 2020 all'interno dell'ID 2014RAHA0090	
89	2018RAHA0017	Rinnovo reti acq. Industriale	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	- 40.000,00	-100%	Scostamento legato al fatto che questo ID cumulativo, in ottica di semplificazione, è stato chiuso in quanto tutte le attività di manutenzione delle reti acquedotto, compreso l'ex acquedotto industriale, sono state rendicontate a partire dal 2020 all'interno dell'ID 2014RAHA0091	
90	2014RAHA0092	Adeg. sicurezza imp. acquedotto– RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	150.000,00	-	-	150.000,00	79.288,19	-	-	79.288,19	- 70.711,81	-47%	Minori esigenze di interventi di adeguamento alla sicurezza degli impianti acquedotto rispetto alla pianificazione
91	2019RAHA0036	Interferenze sotto servizi acquedotto con rete autostradale – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	- 10.000,00	-100%	Non si sono manifestate nel 2021 esigenze di interventi sulla condotte per problematiche di interferenze con la rete autostradale	
92	2019RAHA0039	Interferenze sotto servizi fognatura con rete autostradale – RA – ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	- 10.000,00	-100%	Non si sono manifestate nel 2021 esigenze di interventi sulla condotte per problematiche di interferenze con la rete autostradale	

	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo progettuale	Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 del 27/01/2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
93	2015RAHA0017	Recupero aree serbatoi pensili dismessi – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.200.000,00	67.000,00	-	67.000,00	11.744,18	-	11.744,18	55.255,82	-82%	ID che raggruppa vari interventi di riqualificazione delle aree dei pensili. La pianificazione economica per singolo anno inserita nel piano è di larga massima; ogni anno vengono avviate le attività ritenute necessarie dal servizio, tenendo conto della complessità realizzativa di tali interventi. Nel 2021 è proseguita la progettazione della riqualificazione dell'area pensile Castel Bolognese. Inoltre è stata avviata la progettazione della riqualificazione dell'area pensile S. Agata		
94	2014RAHA0177	Telecontrollo e automaz. imp. acq. – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	20.000,00	-	20.000,00	136.257,66	-	136.257,66	116.257,66	581%	Maggiori esigenze di interventi di adeguamento alla sicurezza degli impianti acquedotto rispetto alla pianificazione		
95	2019RAHA0038	Nuovi allacci/estensioni reti c/to cliente fognatura – RA – ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	120.000,00	120.000,00	-	276.748,87	283.421,50	-	156.748,87	131%	I nuovi allacciamenti e le estensioni reti sono determinate dalla richieste dei clienti. Nel 2021 si è registrata una ripresa del mercato immobiliare e una conseguente maggiore richiesta di questi interventi		
96	2022RAHA0021	Rinnovi e interconnessioni di reti acquedotto - team	A	Opere Pluricomunali	Team	conto cumulativo	-	-	-	-	-	-	-	-			
97	2018RAHA0013	Investimenti struttura - TCSI e TIBSI	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	255.147,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
98	2015RAHA0020	Telecontrollo e automazione impianti fognari – RA – ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	40.000,00	-	40.000,00	54.525,37	-	54.525,37	14.525,37	36%	Maggiori esigenze di intervento sui sistemi di telecontrollo fognario		
99	2019RAHA0037	Distrettualizzazione reti acqua – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	450.000,00	100.000,00	-	100.000,00	71.607,36	-	71.607,36	28.392,64	-28%	ID ricorsivo relativo agli interventi di distrettualizzazione (creazione nuovi distretti, realizzazione camerette per l'installazione della strumentazione di monitoraggio). L' avanzamento annuale è in relazione alle evidenze gestionali dei distretti già esistenti e all'opportunità di implementare ulteriori sviluppi. La pianificazione ipotizzata annualmente è di larga massima		
100	2015RAHA0016	Adeguamento attraversamenti ferroviari – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	90.000,00	10.000,00	-	10.000,00	16.753,45	-	16.753,45	6.753,45	68%	Intervento di natura ricorsiva in arco piano e con pianificazione importi annuali di larga massima. ID relativo alla messa a norma della funzionalità degli attraversamenti. Interventi in corso		
101	2014RAHA0107	Ripristini asfalti fognatura – RA – ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	100.000,00	-	100.000,00	103.167,81	-	103.167,81	3.167,81	3%			
102	2014RAHA0105	Manut. straord. imp. fognatura – RA – ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	480.000,00	-	480.000,00	687.349,55	-	687.349,55	207.349,55	43%	Maggiori esigenze di manutenzione straord. sugli impianti fognari rispetto alla pianificazione		
103	2015RAHA0019	Telecontrollo e automazione impianti depurazione – RA – ATO7	D	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	40.000,00	-	40.000,00	229.045,11	-	229.045,11	189.045,11	473%	Maggiori esigenze di interventi sul sistema di telecontrollo rispetto alla pianificazione		
104	2014RAHA0090	Manut. straord. imp. acquedotto – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	340.000,00	-	340.000,00	465.264,69	-	465.264,69	125.264,69	37%	Maggiori esigenze di manutenzione straord. sugli impianti acquedotto rispetto alla pianificazione		
105	2014RAHA0102	Manut. straord. imp. depurazione – RA – ATO7	D	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	1.130.000,00	-	1.130.000,00	1.590.100,63	-	1.590.100,63	460.100,63	41%	Maggiori esigenze di manutenzione straord. sugli impianti di depurazione rispetto alla pianificazione		
106	2014RAHA0091	Rinnovo reti acqua programmato – RA – ATO7	A	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	1.568.000,00	-	1.568.000,00	1.830.502,63	-	1.830.502,63	262.502,63	17%			
107	2014RAHA0178	Rinnovo reti/allacci fogn. da PI – RA – ATO7	F	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	500.000,00	-	500.000,00	845.256,74	-	845.256,74	345.256,74	69%	Maggiori esigenze di manutenzione straord. conseguente a rotture da pronto intervento in ambito fognario rispetto alla pianificazione		
108	2014RAHA0101	Sistema approvvigionamento idrico Castelbolognese - Con.ami	A	Opere Pluricomunali	Con.ami	20.660.000,00	1.070.000,00	-	1.070.000,00	-	-	-	1.070.000,00	-100%	Intervento in fase di prog. def. Lo scostamento 2021 è legato al fatto che l'AA non era stato sottoscritto al 31/12/2021; i costi sostenuti verranno rendicontati nell' anno di sottoscrizione dell'AA. La scansione temporale di realizzazione di questo intervento è stata ridefinita nel 2022		

							Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 del 27/01/2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
109	2018RAHA0011	Condotte reti bianche, manufatti di scarico, caditoie stradali	AB	Opere Pluricomunali	Gestore	conto cumulativo	200.000,00	-		200.000,00	368.292,69	-		368.292,69	168.292,69	84%	Maggiori esigenze di manutenzione straord. sui sistemi di acque meteoriche rispetto agli importi ipotizzati a piano
110	2018RAHA0005	Potenziamento reti acque meteoriche - I stralcio (collettori+potenziamento idrovora SAPIR)	F	Ravenna	Gestore	4.143.000,00	-	-		-	-	-		-	-	-	
111	2014RAHA0118	Realizzazione adduttrice "Corso nord"- II stralcio	A	Ravenna	Romagna Acque	160.000,00	-	-		-	34.691,70	-	34.691,70	-	34.691,70	100%	Intervento concluso. Scostamento 2021 legato all'ultimazione della fatturazione alla Società degli Asset
112	2014RAHA0156	Collegamento a depurazione di Porto fuori	F	Ravenna	Ravenna Holding	243.000,00	-	-		-	-	-		-	-	-	
113	2019RAHA0056	Tombamento fosso v. Cella san Bartolo	F	Ravenna	Ravenna Holding	1.127.000,00	517.000,00	-	517.000,00	-	-	-		-	517.000,00	-100%	Intervento in fase di prog. prelim. Lo scostamento 2021 è legato al fatto che l'AA non era stato sottoscritto al 31/12/2021; i costi sostenuti verranno rendicontati nell'anno di sottoscrizione dell'AA
114	2014RAHA0122	Adeguam. dep. Lido di Classe - I stralcio	D	Ravenna	Gestore	6.058.000,00	2.250.000,00	-		2.250.000,00	1.633.962,75	-	1.633.962,75	-	616.037,25	-27%	Intervento in esecuzione senza particolari criticità. Avanzamento in linea con la pianificazione di POI che vede la fine lavori nel 2022. Modesto slittamento dovuto ai tempi di fornitura materiali.
115	2018RAHA0015	Adeguamento rete fognaria in zona porto s. Vitale zona SAPIR	F	Ravenna	Romagna Acque	1.090.000,00	229.000,00	-	229.000,00	-	14.200,00	-	14.200,00	-	214.800,00	-94%	Intervento concluso. Scostamento 2021 dovuto alla chiusura del flusso di fatturazione alla società degli Asset
116	2014RAHA0140	Rifacimento sollevamento Ragone	F	Ravenna	Gestore	376.000,00	-	-		-	-	-		-	-	-	
117	2019RAHA0041	Potenziamento centrale idrica Lido Adriano	A	Ravenna	Ravenna Holding	853.173,00	23.000,00	-	23.000,00	-	-	-		-	23.000,00	-100%	Intervento in fase di prog. def. Lo scostamento 2021 è legato al fatto che l'accordo attuativo non era stato sottoscritto al 31/12/2021; i costi sostenuti verranno rendicontati nell'anno di sottoscrizione dell'AA
118	2018RAHA0004	Raccolta acque prima pioggia - II stralcio	F	Ravenna	Gestore	1.000.000,00	101.000,00	-		101.000,00	-	-		-	101.000,00	-100%	Intervento con priorità 2A (DGR 201/2016 e DGR 569/2019) ripianificato a partire dal 2023 visto il persistere di problematiche prevalentemente autorizzative sugli ID di priorità 1A. Emerge inoltre la necessità di rivalutare le indicazioni del piano di indirizzo al fine di avere un approccio omogeneo sui vari territori gestiti da HERA
119	2015RAHA0026	Interventi per riduzione carichi scolmatori - sollevamento Bidente	F	Ravenna	Soc. Asset non definita	6.600.000,00	107.000,00	-	107.000,00	-	-	-		-	107.000,00	-100%	Scostamento legato alla riprogrammazione dell'intervento con priorità 2A in relazione alle priorità e coerentemente con le nuove scadenze normative (DGR 2153 del 20/12/2021)
120	2019RAHA0050	Adeguamento rete fognaria Porto Fuori - nuova rete	F	Ravenna	Soc. Asset non definita	1.200.000,00	-	-		-	-	-		-	-	-	
121	2014RAHA0141	Rifacimento sollevamento Gambellara	F	Ravenna	Gestore	502.000,00	50.000,00	-		50.000,00	7.591,18	-	7.591,18	-	42.408,82	-85%	Scostamento 2021 legato all'anticipazione di costi al 2020. Intervento concluso
122	2014RAHA0151	Collegamento a depurazione Mensa-Matellica	F	Ravenna	Romagna Acque	526.000,00	-	-		-	-	-		-	-	-	
123	2019RAHA0043	Nuovo impianto caditoie a depuratore di Ravenna	D	Ravenna	Romagna Acque	2.670.000,00	46.000,00	-	46.000,00	-	-	-		-	46.000,00	-100%	Intervento in fase di prog. def. Lo scostamento 2021 è legato al fatto che l'accordo attuativo non era stato sottoscritto al 31/12/2021; i costi sostenuti verranno rendicontati nell'anno di sottoscrizione dell'AA
124	2014RAHA0120	Compl. cond. idrica Ravenna nord Casalborsetti	A	Ravenna	Romagna Acque	1.453.006,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-		-	80.000,00	-100%	Intervento in fase di prog. def. Lo scostamento 2021 è legato al fatto che l'accordo attuativo non era stato sottoscritto al 31/12/2021; i costi sostenuti verranno rendicontati nell'anno di sottoscrizione dell'AA
125	2017RAHA0009	Completamento della separazione delle reti in località Casalborsetti	F	Ravenna	Gestore	250.000,00	-	-		-	-	-		-	-	-	
126	2014RAHA0123	Depuratore Ravenna - adeguamento linea fanghi	D	Ravenna	Gestore	5.000.000,00	-	-		-	-	-		-	-	-	
127	2019RAHA0055	Rifacimento sollevamento Lido Adriano	F	Ravenna	Soc. Asset non definita	853.000,00	-	-		-	-	-		-	-	-	

							Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Ravenna n. 1 del 27/01/2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
179	2017RAHA0016	Ricostruzione premente sollevamento Madonna della salute – I stralcio	F	Solarolo	Gestore	330.000,00	-	-		-	5.189,61	-		5.189,61	5.189,61	100%	Il primo e secondo lotto dell'intervento sono stati completati. Lo scostamento è dovuto al fatto che stanno proseguendo ulteriori attività di completamento che verranno tracciate nel terzo lotto attualmente in esecuzione
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura		
Importo Totale							26.169.121,00	3.306.000,00	6.911.000,00	15.952.121,00	21.353.486,07	1.723.519,57	1.843.361,58	17.786.604,92			
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura							24.369.400,00	3.306.000,00	6.911.000,00	14.152.400,00	21.353.486,07	1.723.519,57	1.843.361,58	17.786.604,92	88%		



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ravenna

F.to Valentina Palli

Il segretario verbalizzante

F.to Daniele Cristofori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2023

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
