

**CLRN/2024/2 del 19 gennaio 2024**

**CONSIGLIO LOCALE di RIMINI**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

**IL COORDINATORE**

.....Daniele Morelli.....

CLRN/2024/2

### CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 9:00 si è riunito il Consiglio Locale di Rimini convocato con lettera protocollo PG.AT/2024/0000168 del 11/01/2024, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Daniele Morelli. Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI RIMINI	Morelli Daniele	Consigliere	SI	10,0000
BELLARIA IGEA MARINA	Ceccarelli Adele	Assessore	SI	4,9895
CASTELDELICI			NO	0,4219
CATTOLICA	Uguccione Alessandro	Assessore	SI	4,2784
CORIANO	Pazzaglia Anna	Assessore	SI	2,8251
GEMMANO			NO	0,5988
MAIOLO			NO	0,5205
MISANO ADRIATICO	Piccioni Fabrizio	Sindaco	SI	3,6415
MONDAINO			NO	0,6480
MONTECOPIOLO	Rossi Pietro	Sindaco	SI	0,5802
MONTEFIORE CONCA			NO	0,8678
MONTEGRIDOLFO			NO	0,5694
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO	Casadei Gian Marco	Sindaco	SI	1,9471
MORCIANO DI ROMAGNA			NO	2,0428
NOVAFELTRIA	Madei Monica	Assessore	SI	2,0063
PENNABILLI			NO	0,9597
POGGIO TORRIANA			NO	1,5630
RICCIONE	Imola Simone	Assessore	SI	8,6178
RIMINI	Montini Anna	Assessore	SI	36,1532
SALUDECIO			NO	1,0581
SAN CLEMENTE	Flacco Luca	Assessore	SI	1,6835
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	Gabellini Nicola	Assessore	SI	2,5823
SAN LEO	Bindi Leonardo	Sindaco	SI	1,0075
SANT'AGATA FELTRIA	Polidori Goffredo	Sindaco	SI	0,8098
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Fussi Pamela	Vice-Sindaco	SI	5,6472
SASSOFELTRIO	Medici Fabio	Sindaco	SI	0,6587
TALAMELLO			NO	0,5864
VERUCCHIO	Sandon Roberto	Assessore	SI	2,7358

Presenti n. 17 quote 90,164

Assenti n. 11 quote 9,836

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Morelli invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art. 7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l'Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n.1 del 27 gennaio 2020 il Consiglio locale di Rimini ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 del Gestore Hera Spa;
- con deliberazione n.12 del 26 luglio 2022 il Consiglio locale di Rimini ha approvato la revisione del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2022-2023 del Gestore Hera s.p.a.;

**considerato** altresì che:

- con deliberazione n. 84 del 12 settembre 2022 il Consiglio d'ambito ha approvato la revisione delle "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato" di cui alla CAMB n.75/2017;
- tale deliberazione tra l'altro dispone che il Consiglio Locale:
  - esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
  - individua gli interventi per i quali avviare eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Gestore da proporre al Consiglio d'ambito, in relazione a quanto previsto dalle Convenzioni di servizio vigenti;
  - ratifica la revisione puntuale del POI avvenuta con nulla osta della struttura tecnica di ATERSIR;
  - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

**dato atto** che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 attraverso il software ARSI;

**dato atto** altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2022 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**rilevato** che:

- nell'annualità 2022 dalla struttura tecnica di ATERSIR è stato rilasciato un nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.84/2022 relativo ad interventi del bacino di Rimini, rintracciabile al protocollo dell'Agenzia al PG.AT/2022/0012931 del 27/12/2022;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati superiore di 109.194.20 € rispetto a quanto previsto nell'annualità 2022 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale sostanzialmente trascurabile;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

**ritenuto** pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**a voti** resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 16 (quote 86,522), astenuti n. 1 (quote 3.641), contrari n.0;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n 2 del 19 gennaio 2024

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 19 gennaio 2024

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI  
ANNO 2022**

**GESTORE: HERA S.P.A.**

**BACINO PROVINCIALE DI: RIMINI**

## 1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2022, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Rimini n.3 del 28 settembre 2020, successivamente aggiornato con Delibera n.12 del 26 luglio 2022, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO2022	CONSUNTIVO2022	DIFFERENZA	DIFF%
<b>GESTORE</b>	9.903.653,00€	18.020.493,47€	8.116.840,47€	82%
<b>SOCIETA' TERZE</b>	12.260.000,00€	9.425.631,90€	-2.834.368,10€	-23%
<b>FONDO PERDUTO</b>	7.002.000,00€	1.828.721,83€	-5.173.278,17€	-74%
<b>TOTALE</b>	<b>29.165.653,00€</b>	<b>29.274.847,20€</b>	<b>109.194,20€</b>	<b>0%</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022

Gli investimenti di struttura per l'anno 2022 non sono ancora stati rendicontati (max. 1.782.548,00 €). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2022 investimenti sostanzialmente allineati rispetto al pianificato.

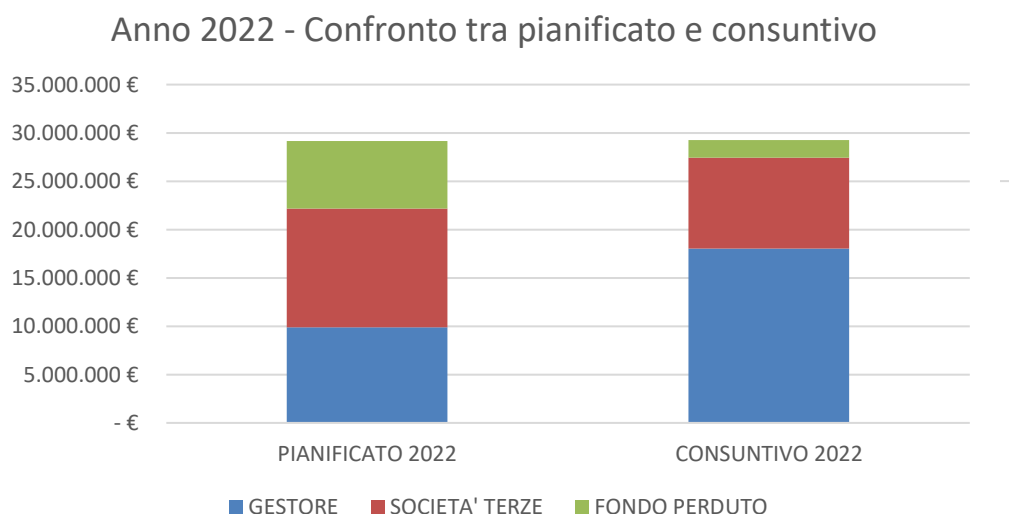


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022



Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

## 2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si notano maggiori investimenti nel comparto acquedottistico rispetto al pianificato, mentre il comparto fognario-depurativo presenta consuntivati sensibilmente inferiori ai programmati. Si registrano alcuni ritardi nelle fasi di progettazione e per ridefinizione di alcune priorità a fronte di nuove esigenze.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF %
<b>ACQUEDOTTO</b>	10.221.153,00€	13.896.742,14€	3.675.589,14€	36%
<b>DEPURAZIONE</b>	3.467.000,00€	3.046.733,28€	-420.266,72€	-12%
<b>FOGNATURA</b>	14.977.500,00€	12.209.091,49€	-2.768.408,51€	-18%
<b>ACQUE BIANCHE</b>	500.000,00€	122.280,29€	-377.719,71€	-76%
<b>Totale</b>	<b>29.165.653,00€</b>	<b>29.274.847,20€</b>	<b>109.194,20€</b>	<b>0%</b>

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

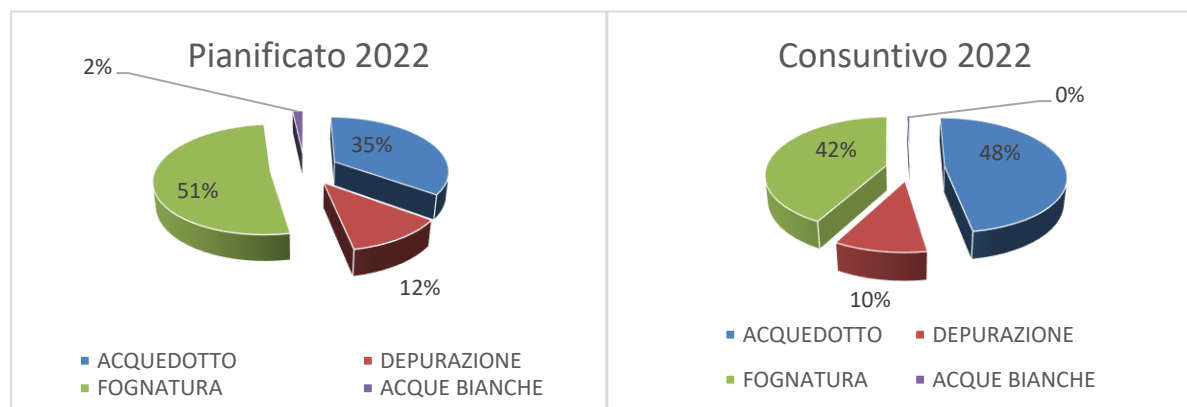


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2022 per servizio

La tabella successiva dà una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie, costituite da opere specifiche di manutenzione straordinaria individuate nel programma investimenti e dai titoli cumulativi di manutenzione straordinaria; per quest'ultimi è previsto un budget complessivo a cui il Gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno.

	<b>PIANIFICATO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFFERENZA €</b>	<b>DIFF %</b>
<b>ACQUEDOTTO</b>	4.340.140,00 €	8.433.075,81 €	4.092.935,81 €	94,30%
<b>DEPURAZIONE</b>	1.480.000,00 €	2.175.535,66 €	695.535,66 €	47,00%
<b>FOGNATURA</b>	2.243.000,00 €	3.161.382,54 €	918.382,54 €	40,94%
<b>ACQUE BIANCHE</b>	500.000,00 €	122.280,29 €	-377.719,71 €	-75,54%
<b>TOTALE</b>	<b>8.563.140,00 €</b>	<b>13.892.274,30 €</b>	<b>5.329.134,30 €</b>	<b>62,23%</b>

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi. Sono esclusi dal conteggio gli interventi già conclusi in annualità precedenti ma ancora presenti a piano con pianificato e consuntivato pari a zero (n.17), gli interventi annullati (n.12) e gli investimenti di struttura (n.2).

<b>CLASSI D'IMPORTO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>PIANIFICATO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFF. %</b>
<b>Fino a 500.000 €</b>	33	1.533.159,00 €	1.134.474,02 €	- 398.684,98 €	-26%
<b>500.000-1.000.000 €</b>	17	997.000,00 €	450.243,12 €	- 573.213,03 €	-56%
<b>1.000.000-2.000.000 €</b>	12	981.000,00 €	779.428,56 €	- 175.115,29 €	-18%
<b>2.000.000-5.000.000 €</b>	16	1.818.000,00 €	1.657.069,00 €	- 160.931,00 €	-9%
<b>Oltre 5.000.000 €</b>	17	11.611.500,00 €	7.575.477,63 €	- 4.036.022,37 €	-35%
<b>Titoli cumulativi</b>	33	12.224.994,00 €	17.678.154,87 €	5.453.160,87 €	45%
<b>TOTALE</b>	<b>128</b>	<b>29.165.653,00 €</b>	<b>29.274.847,20 €</b>	<b>109.194,20 €</b>	<b>0%</b>

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.

- Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 100;
- Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2022: 76.

	<b>NUMERO INTERVENTI</b>	<b>IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022</b>	<b>IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2022</b>
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%), cd "non avviati"	26	3.275.854,00€	-€
Interventi con un valore pianificato pari a 0 e un valore consuntivato diverso da 0 (+100%)	2	-€	14.961,26€
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	61	18.983.299,00€	23.040.398,87€
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	13	6.906.500,00€	6.219.487,07€

TAB.5 – Corrispondenza fra importi pianificati e consuntivati

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti maggiori del +/- 20% sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

Di seguito la tabella degli interventi non avviati.

**INTERVENTI NON AVVIATI**

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022
1	2021RNHA0007	Demolizione e messa in sicurezza ex. dep. Bellaria	DEPURAZIONE	Bellaria Igea Marina	Gestore	1.200.000,00€	30.000,00€
2	2020RNHA0002	Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca	DEPURAZIONE	Cattolica	Gestore	1.300.000,00€	50.000,00€
3	2017RNHA0003	ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA	DEPURAZIONE	Cattolica	Gestore	600.000,00€	10.000,00€
4	2022RNHA0034	SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA	FOGNATURA	Cattolica	Gestore	11.100.000,00€	200.000,00€
5	2017RNHA0011	RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL SOLLEVAMENTO "PENNACCHINI"	FOGNATURA	Misano Adriatico	Gestore	1.080.000,00€	36.000,00€
6	2020RNHA0003	Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica	DEPURAZIONE	Misano Adriatico	Gestore	2.800.000,00€	50.000,00€
7	2022RNHA0026	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO (AP 10)	FOGNATURA	Misano Adriatico	Gestore	1.400.000,00€	40.000,00€
8	2022RNHA0030	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 15)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	600.000,00€	30.000,00€
9	2014RNHA0011	COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	FOGNATURA	Novafeltria	Gestore	346.000,00€	20.000,00€
10	2015RNHA0001	Riordino dello schema idrico del Conca	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	1.908.842,00€	400.000,00€
11	2022RNHA0035	INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO INDIRIZZO CLRN 14/2021	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		1.074.854,00€
12	2017RNHA0017	ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA)	FOGNATURA	Riccione	Gestore	100.000,00€	5.000,00€
13	2014RNHA0048	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE	FOGNATURA	Riccione	Gestore	2.725.000,00€	37.000,00€
14	2017RNHA0015	ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI TRATTAMENTO ODORI DEL DEPURATORE DI RICCIONE	DEPURAZIONE	Riccione	Gestore	2.116.000,00€	24.000,00€
15	2017RNHA0018	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA	FOGNATURA	Riccione	Gestore	50.000,00€	20.000,00€
16	2021RNHA0005	REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMINAZIONE DEL DEPURATORE DI RICCIONE	DEPURAZIONE	Riccione	Gestore	3.360.000,00€	30.000,00€
17	2014RNHA0067	PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (Piazzale Kennedy)	FOGNATURA	Rimini	Gestore	30.770.571,00€	234.000,00€
18	2022RNHA0015	RIFACIMENTO PREMENTE 1B	FOGNATURA	Rimini	Gestore	602.000,00€	20.000,00€
19	2017RNHA0021	SOSTITUZIONE PERIODICA SISTEMA DI FILTRI A MEMBRANA DEL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA	DEPURAZIONE	Rimini	Gestore	6.000.000,00€	300.000,00€
20	2015RNHA0017	SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI	FOGNATURA	Rimini	Gestore	50.000,00€	50.000,00€
21	2021RNHA0004	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	FOGNATURA	Rimini	NON DEFINITO	37.903.417,00€	414.000,00€
22	2020RNHA0012	COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD	FOGNATURA	Rimini	Gestore	1.038.000,00€	55.000,00€
23	2021RNHA0012	REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	2.880.000,00€	30.000,00€
24	2022RNHA0012	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	305.000,00€	36.000,00€
25	2022RNHA0033	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN GIOVANNI (SFAM 1)	FOGNATURA	San Giovanni in Marignano	Gestore	5.500.000,00€	50.000,00€
26	2017RNHA0026	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIE PELLICO, BRUXELLES	FOGNATURA	Santarcangelo di Romagna	Gestore	100.000,00€	30.000,00€

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Rimini n.12 del 26 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
1	2022RNHA0019	RIFACIMENTO CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO 2 BELLARIA	F	Bellaria Igea Marina	Gestore	850.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2021RNHA0007	Demolizione e messa in sicurezza ex. dep. Bellaria	D	Bellaria Igea Marina	Gestore	1.200.000,00€	30.000,00€	- €	- €	30.000,00€	- €	- €	- €	- €	30.000,00€	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
3	2018RNHA0012	Realizzazione di nuova fognatura nera in zona Rio Pircio	F	Bellaria Igea Marina	AMIR	771.972,00€	10.000,00€	- €	10.000,00€	- €	115.126,05€	- €	115.126,05€	- €	105.126,05€	1051	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
4	2020RNHA0002	Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca	D	Cattolica	Gestore	1.300.000,00€	50.000,00€	- €	- €	50.000,00€	- €	- €	- €	- €	50.000,00€	-100	RITARDO INIZIO PROGETTAZIONE DOVUTO AL FATTO CHE SUL DEPURATORE DI CATTOLICA SONO NECESSARI SVARIATI INTERVENTI (ID SPECIFICI) CHE NON SI CONCILIANO CON GLI ESIGUI SPAZI ANCORA DISPONIBILI NELL'AREA. SI RENDE NECESSARIO, AL FINE DI UNA VALUTAZIONE PIU' AMPIA E INTEGRATA, EFFETTUARE UN'INDAGINE SUGLI EFFETTIVI VOLUMI ATTUALMENTE SCARICATI, INFORMAZIONE OGGI NON DISPONIBILE. OCCORRE PERTANTO EFFETTUARE UNA CAMPAGNA DI MISURA SPECIFICA.
5	2021RNHA0011	Adeguamento linea fanghi depuratore Cattolica	D	Cattolica	Gestore	3.112.000,00€	30.000,00€	- €	- €	30.000,00€	198.878,22€	- €	- €	198.878,22€	168.878,22€	562	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL MAGGIOR AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI RISPETTO AGLI IMPORTI PREVISTI A POI
6	2022RNHA0021	SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI CATTOLICA - ZONA DELLE NAZIONI	F	Cattolica	Gestore	204.663,00€	50.000,00€	- €	- €	50.000,00€	23.404,91€	- €	- €	23.404,91€	26.595,09€	-53	INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE. CON ULTIMATA PROGETTAZIONE NEL 2022 E PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI NEL 2023. SCOSTAMENTO 2022 UNICAMENTE DI NATURA ECONOMICA LEGATO AL FLUSSO DELLE CONTABILITA'
7	2018RNHA0004	Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo De Amicis (SFEM 19)	F	Cattolica	Gestore	10.172.809,00€	307.000,00€	- €	- €	307.000,00€	453.853,01€	- €	- €	453.853,01€	146.853,01€	47	AVVIATO CANTIERE A FINE 2022. NON SI EVIDENZIATO CRITICITA' RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO A POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FLUSSO CONTABILE
8	2020RNHA0011	SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI CATTOLICA - ZONA DELLE REGIONI	F	Cattolica	AMIR	503.784,00€	177.000,00€	- €	177.000,00€	- €	178.021,61€	- €	178.021,61€	- €	1.021,61€	0	
9	2022RNHA0020	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN VIA DEL PORTO	F	Cattolica	Gestore	150.000,00€	30.000,00€	- €	- €	30.000,00€	114.269,31€	- €	- €	114.269,31€	84.269,31€	280	INTERVENTO COMPLETATO TECNICAMENTE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL 2023 COME DA RICHIESTA DEL COMUNE DI CATTOLICA CHE DOVEVA REALARE GLI ARREDI URBANI NEI TEMPI CONGRUI ALLA STAGIONE BALNEARE
10	2018RNHA0005	Ottimizzazione sistema fognario di Cattolica - Bacino via Toscana e strade limitrofe	F	Cattolica	Gestore	550.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
11	2017RNHA0004	INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "VIENNA"	F	Cattolica	AMIR	84.206,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
12	2014RNHA0003	REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA	F	Cattolica	Gestore	250.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
13	2022RNHA0023	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE REGIONI	A	Cattolica	Gestore	136.994,00€	86.994,00€	- €	- €	86.994,00€	10.809,51€	- €	- €	10.809,51€	76.184,49€	-87	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA SOSPENSIONE DEI LAVORI CONSEGUENTE ALLA SEGNALEZIONE IN CANTIERE DA PARTE DI SPTC RIGUARDANTE LA NECESSITA' DI ATTUARE UNA VARIANTE ALLO SCARICO FOGNARIO (CONTESTUALE ALLE OPERE DI ACQUEDOTTO) SUL TORRENTE VENTENA.
14	2021RNHA0008	Revamping digestori Cattolica	D	Cattolica	Gestore	980.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2017RNHA0003	ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA	D	Cattolica	Gestore	600.000,00€	10.000,00€	- €	- €	10.000,00€	- €	- €	- €	- €	10.000,00€	-100	RIPIANIFICATA PROGETTAZIONE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI SVILUPPARE LO STUDIO CONGIUNTAMENTE AD ALTRI INTERVENTI SUL DEPURATORE DI CATTOLICA. AL FINE DI AVERE UNA VISIONE COMPLESSIVA
16	2022RNHA0024	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE NAZIONI	A	Cattolica	Gestore	165.165,00€	85.165,00€	- €	- €	85.165,00€	2.372,96€	- €	- €	2.372,96€	82.792,04€	-97	SCOSTAMENTO 2022 UNICAMENTE DI NATURA ECONOMICA LEGATO AL FLUSSO DELLE CONTABILITA'. ULTIMATA PROGETTAZIONE NEL 2022 E PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI NEL 2023.
17	2022RNHA0034	SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA	F	Cattolica	Gestore	11.100.000,00€	200.000,00€	- €	- €	200.000,00€	- €	- €	- €	- €	200.000,00€	-100	RITARDO AVVIO PROGETTAZIONE DOVUTO A NECESSARI APPROFONDIMENTI DEI BENEFICI POST REALIZZAZIONE VASCA DE AMICIS (ID 2018RNHA0004). SONO IN CORSO NEL 2023 INTERVENTI, PROGETTATI NEL 2022 E CONTABILIZZATI ALL' INTERNO DEGLI ID MICRONINTERVENTI RELATIVE ALLE MANUTENZIONI, FINALIZZATI A MEDESIMO OBIETTIVO DI SEPARAZIONE DELLE RETI.
18	2021RNHA0010	Nuova rete fognaria in via della Repubblica localita Sant'Andrea in Besanigo	F	Coriano	AMIR	350.000,00€	94.000,00€	- €	94.000,00€	- €	63.495,85€	- €	63.495,85€	- €	30.504,15€	-32	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AVVIO DEI LAVORI PREVISTO PER LA FINE DEL 2023
19	2017RNHA0007	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA LOCALITA' SANT'ANDREA IN BESANIGO	F	Coriano	Gestore	150.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
20	2019RNHA0002	Completamento separazione della rete fognaria limitrofa a via di Vittorio - Il stralcio (Lotto 1)	F	Coriano	AMIR	170.345,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
21	2014RNHA0005	COSTR. DI FOGNATURA LUNGO VIA MULAZZANO (SC.3)	F	Coriano	Gestore	988.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
22	2017RNHA0005	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - Il stralcio - (Lotto2)	F	Coriano	Gestore	247.000,00€	42.000,00€	- €	- €	42.000,00€	31.028,37€	- €	- €	31.028,37€	10.971,63€	-26	
23	2017RNHA0006	NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PASSANO TRA VIA FLAMINIA CONCA E VIA STRACCIARINO	F	Coriano	Gestore	60.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
24	2017RNHA0008	REVAMPING DEPURATORE DI MISANO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SU LINEA ACQUE	D	Misano Adriatico	Gestore	290.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
25	2017RNHA0011	RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL SOLLEVAMENTO "PENNACCHINI"	F	Misano Adriatico	Gestore	1.080.000,00€	36.000,00€	- €	- €	36.000,00€	- €	- €	- €	- €	36.000,00€	-100	RITARDO AVVIO PROGETTAZIONE DOVUTO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'. IN RELAZIONE ALL' ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA'
26	2020RNHA0003	Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica	D	Misano Adriatico	Gestore	2.800.000,00€	50.000,00€	- €	- €	50.000,00€	- €	- €	- €	- €	50.000,00€	-100	RIPIANIFICATA PROGETTAZIONE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI SVILUPPARE LO STUDIO CONGIUNTAMENTE AGLI ALTRI INTERVENTI SUL DEPURATORE DI CATTOLICA AL FINE DI AVERE UNA VISIONE COMPLESSIVA
27	2017RNHA0009	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA )	F	Misano Adriatico	Gestore	1.000.000,00€	30.000,00€	- €	- €	30.000,00€	3.543,85€	- €	- €	3.543,85€	26.456,15€	-88	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI SU INTERAZIONI TRA RETICOLO FOGNARIO E RETICOLO SUPERFICIALE, ANCHE IN RELAZIONE ALL' ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA'
28	2022RNHA0026	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO (AP 10)	F	Misano Adriatico	Gestore	1.400.000,00€	40.000,00€	- €	- €	40.000,00€	- €	- €	- €	- €	40.000,00€	-100	RIPIANIFICAZIONE LEGATA ALLO SVILUPPO DI APPROFONDIMENTI PER SOLUZIONI ALTERNATIVE / MIGLIORATIVE RELATIVE ALL' ABBATTIMENTO DEI CARICH

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Rimini n.12 del 26 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
29	2015RNHA0010	ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO	F	Monte Colombo	Gestore	200.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
30	2017RNHA0012	RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATORE S.SAVINO MONTECOLOMBO	D	Monte Colombo	Gestore	400.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
31	2014RNHA0010	ADEGUAMENTO SCARICHI N.4-5-6-7-13 MONTESCUDO	F	Montescudo	Gestore	1.500.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
32	2015RNHA0011	MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2 COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA F.CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA	F	Montescudo	Gestore	100.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
33	2020RNHA0010	Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura - FSC	F	Montescudo-Monte Colombo	Gestore	448.090,00€	273.000,00€	273.000,00€	- €	- €	27.339,66€	- €	- €	27.339,66€	- 245.660,34€	-89	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL PERFEZIONAMENTO DI ACCORDI BONARI PER POSA DELLE CONDOTTE IN AREA PRIVATA
34	2018RNHA0008	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 15)	A	Montescudo-Monte Colombo	Gestore	140.000,00€	90.000,00€	- €	- €	90.000,00€	114.460,32€	- €	- €	114.460,32€	24.460,32€	27	INTERVENTO COMPLETATO TECNICAMENTE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE NELLE PASSATE ANUALITA'. IN CORSO ITER PER RECUPERO CONTRIBUTO
35	2022RNHA0030	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 15)	F	Morciano di Romagna	Gestore	600.000,00€	30.000,00€	- €	- €	30.000,00€	- €	- €	- €	- 30.000,00€	-100	RIPIANIFICAZIONE LEGATA ALLO SVILUPPO DI APPROFONDIMENTI PER SOLUZIONI ALTERNATIVE / MIGLIORATIVE RELATIVE ALL' ABBATTIMENTO DEI CARICHI	
36	2022RNHA0029	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 17)	F	Morciano di Romagna	Gestore	600.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
37	2014RNHA0044	COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA-MORCIANO	F	Morciano di Romagna	AMIR	205.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
38	2022RNHA0027	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFEM 1)	F	Morciano di Romagna	Gestore	750.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
39	2022RNHA0028	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 14)	F	Morciano di Romagna	Gestore	600.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
40	2022RNHA0031	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 19)	F	Morciano di Romagna	Gestore	600.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
41	2014RNHA0011	COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	F	Novafeltria	Gestore	346.000,00€	20.000,00€	- €	- €	20.000,00€	- €	- €	- €	- 20.000,00€	-100	SI CONFERMA CHE DALLE PROGETTAZIONI SONO EMERSE ALCUNE CRITICITA' REALIZZATIVE ANCORA IN CORSO DI APPROFONDIMENTO. UNA VOLTA INDIVIDUATA LA SCELTA PROGETTUALE OTTIMALE VERRA' AVVIATO L' ITER AUTORIZZATIVO PRESSO GLI ENTI PREPOSTI	
42	2014RNHA0012	PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI	A	Novafeltria	Gestore	270.000,00€	- €	- €	- €	- €	12.590,53€	- €	- €	12.590,53€	12.590,53€	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AD ATTIVITA' RESIDUE IN CAPO ALL' UFFICIO PATRIMONIO
43	2015RNHA0012	ADEGUAMENTO SCARICO N. 40 CA' GIANESSI (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	F	Novafeltria	Gestore	50.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
44	2015RNHA0025	VERIFICA E ADEGUAMENTI SISMICI IMP. ACQ. RN ATO9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
45	2015RNHA0001	Riordino dello schema idrico del Conca	A	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	1.908.842,00€	400.000,00€	- €	400.000,00€	- €	- €	- €	- €	- 400.000,00€	-100	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AD ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI	
46	2014RNHA0085	RINNOVO RETI/ALL. FOGNATURA DA PI	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00€	- €	- €	200.000,00€	478.929,81€	- €	- €	478.929,81€	278.929,81€	139	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
47	2020RNHA0004	Interventi per l'attuazione del Piano di Indirizzo delle acque di prima pioggia (priorità 2)	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
48	2020RNHA0005	Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema fognario	F	Opere Pluricomunali	Gestore	11.300.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
49	2022RNHA0007	MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - AMIR	F	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	150.000,00€	- €	150.000,00€	- €	97.633,56€	- €	97.633,56€	- 52.366,44€	-34	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-2022RNHA0009. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDDDEETTI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 2,1 M.NI)	
50	2017RNHA0029	Investimenti di struttura	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.782.548,00€	- €	- €	1.782.548,00€	- €	- €	- €	- 1.782.548,00€	-100	INVESTIMENTI DI STRUTTURA RENDICONTATI SEPARATAMENTE	
51	2022RNHA0035	INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO INDIRIZZO CLRN 14/2021	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.074.854,00€	- €	- €	1.074.854,00€	- €	- €	- €	- 1.074.854,00€	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE GLI IMPORTI 2022 DI QUESTO ID SONO STATI UTILIZZATI PER INTERVENTI DI BONIFICA RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO E RENDICONTATI NEGLI ID 2014RNHA0014 E 2014RNHA0015	
52	2022RNHA0004	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - SIS	A	Opere Pluricomunali	SIS	- €	150.000,00€	- €	150.000,00€	- €	116.608,88€	- €	116.608,88€	- 33.391,12€	-22	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0002-2022RNHA0004-2022RNHA0006-2022RNHA0008-2022RNHA0010. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDDDEETTI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 1,9 M.NI)	
53	2014RNHA0018	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00€	- €	- €	30.000,00€	21.602,34€	- €	- €	21.602,34€	- 8.397,66€	-27	
54	2015RNHA0004	RAZIONALIZZAZIONE SIST. ACQ SENATELLO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	3.359.000,00€	91.000,00€	- €	- €	91.000,00€	83.660,05€	- €	- €	83.660,05€	- 7.339,95€	-8	
55	2014RNHA0084	Telecontrollo e automazione impianti acquedotto	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00€	- €	- €	50.000,00€	184.530,35€	- €	- €	184.530,35€	134.530,35€	269	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
56	2014RNHA0022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL.FOGNATURA - RN	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00€	- €	- €	150.000,00€	852.509,06€	- €	- €	852.509,06€	702.509,06€	468	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
57	2014RNHA0014	RINNOVO RETI PROGRAMMATE - RN - ATO9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.660.140,00€	- €	- €	1.660.140,00€	2.322.795,29€	- €	- €	2.322.795,29€	662.655,29€	39	CONTO CUMULATIVO. QUESTO ID RICOMPRENDE GLI INTERVENTI FINANZIATI DALL' ID 2022RNHA0035
58	2014RNHA0025	RILIEVO RETI FOGNARIE - RN - ATO 9	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
59	2021RNHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00€	- €	- €	20.000,00€	91.060,03€	- €	- €	91.060,03€	71.060,03€	355	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
60	2022RNHA0006	MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - SIS	F	Opere Pluricomunali	SIS	- €	600.000,00€	- €	600.000,00€	- €	72.708,71€	- €	72.708,71€	- 527.291,29€	-87	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0002-2022RNHA0004-2022RNHA0006-2022RNHA0008-2022RNHA0010. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDDDEETTI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 1,9 M.NI)	
61	2014RNHA0015	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	300.000,00€	- €	- €	300.000,00€	1.524.953,32€	- €	- €	1.524.953,32€	1.224.953,32€	408	CONTO CUMULATIVO. QUESTO ID RICOMPRENDE GLI INTERVENTI FINANZIATI DALL' ID 2022RNHA0035

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Rimini n.12 del 26 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
62	2018RNHA0002	Dismissione dep.Ponte S.M.Maddalena e coll.fognario	F	Opere Pluricomunali	AMIR	961.000,00€	111.000,00€	- €	111.000,00€	- €	37.200,92€	- €	37.200,92€	- €	73.799,08 €	-66	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 E' CONSEGUENTE AI RITARDI SUBITI DALLE ATTIVITA' DI CANTIERE PER LA NECESSITA' DI DEFINIRE UNA VARIANTE SISMICA DEL SOLLEVAMENTO E A CAUSA DELLA NECESSARIA SISTEMAZIONE DELL' ARGINE. PREVISTO COMPLETAMENTO DELL'ITER AUTORIZZATIVO ENTRO FINE 2023
63	2018RNHA0011	Investimenti di struttura - TICSI e TIBSI	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	225.381,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
64	2022RNHA0005	MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - AMIR	F	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	600.000,00€	- €	600.000,00€	- €	329.202,48€	- €	329.202,48€	- €	270.797,52 €	-45	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-2022RNHA0009. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDEETI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 2,1 M.NI)
65	2014RNHA0023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - RN	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00€	- €	- €	200.000,00€	753.748,73€	- €	- €	753.748,73€	553.748,73 €	276	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
66	2015RNHA0024	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI RN ATO9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
67	2022RNHA0001	RINNOVO RETI IDRICHE- RN - ATO9 - AMIR	A	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	600.000,00€	- €	600.000,00€	- €	1.168.831,74€	- €	1.168.831,74€	- €	568.831,74 €	94	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-2022RNHA0009. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDEETI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 2,1 M.NI)
68	2014RNHA0021	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	480.000,00€	- €	- €	480.000,00€	1.512.779,37€	- €	- €	1.512.779,37€	1.032.779,37 €	215	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
69	2014RNHA0024	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00€	- €	- €	200.000,00€	111.155,49€	- €	- €	111.155,49€	88.844,51 €	-44	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO
70	2017RNHA0013	RICOGNIZIONE E STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO AGGLOMERATI -200 a.e. (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
71	2022RNHA0010	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - SIS	D	Opere Pluricomunali	SIS	- €	500.000,00€	- €	500.000,00€	- €	207.570,05€	- €	207.570,05€	- €	292.429,95 €	-58	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0002-2022RNHA0004-2022RNHA0006-2022RNHA0008-2022RNHA0010. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDEETI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 1,9 M.NI)
72	2021RNHA0001	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO 9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	70.000,00€	- €	- €	70.000,00€	162.855,53€	- €	- €	162.855,53€	92.855,53 €	132	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 9. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALEMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2022 RISULTANO IN PROGETTAZIONE LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PENSILE DI SALUDECIO E CATTOLICA
73	2021RNHA0003	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 9	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00€	- €	- €	50.000,00€	5.242,05€	- €	- €	5.242,05€	44.757,95 €	-89	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI
74	2014RNHA0016	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	400.000,00€	- €	- €	400.000,00€	1.279.201,89€	- €	- €	1.279.201,89€	879.201,89 €	219	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
75	2014RNHA0019	DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
76	2015RNHA0009	Telecontrollo e automazione impianti fog. RN	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00€	- €	- €	200.000,00€	193.660,56€	- €	- €	193.660,56€	6.339,44 €	-3	
77	2014RNHA0020	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00€	- €	- €	30.000,00€	68.603,20€	- €	- €	68.603,20€	38.603,20 €	128	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
78	2022RNHA0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE BIANCHE	AB	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250.000,00€	- €	- €	250.000,00€	72.751,40€	- €	- €	72.751,40€	177.248,60 €	-70	CONTO CUMULATIVO - MINORI NECESSITA' DI INTERVENTO SUGLI IMPAINTI DELLE ACQUA REFLUE BIANCHE RISPETTO AGLI IMPORTI IPOTIZZATI A POI
79	2020RNHA0007	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - RN - ATO9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	700.000,00€	700.000,00€	- €	- €	1.696.467,43€	1.088.089,43€	- €	608.378,00€	996.467,43 €	142	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.
80	2014RNHA0081	Sostituzione contatori pari calibro	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.220.000,00€	- €	- €	1.220.000,00€	1.031.496,06€	- €	- €	1.031.496,06€	188.503,94 €	-15	
81	2020RNHA0008	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - RN - ATO9	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	300.000,00€	300.000,00€	- €	- €	640.940,78€	740.632,40€	- €	99.691,62€	340.940,78 €	113	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.
82	2022RNHA0009	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - AMIR	D	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	500.000,00€	- €	500.000,00€	- €	455.186,24€	- €	455.186,24€	- €	44.813,76 €	-8	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-2022RNHA0009. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDEETI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 2,1 M.NI)
83	2017RNHA0014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI BIANCHE	AB	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250.000,00€	- €	- €	250.000,00€	49.528,89€	- €	- €	49.528,89€	200.471,11 €	-80	CONTO CUMULATIVO - MINORI NECESSITA' DI INTERVENTO SULLE RETI FOGNARIE BIANCHE RISPETTO AGLI IMPORTI IPOTIZZATI A POI



Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Rimini n.12 del 26 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
84	2022RNHA0003	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - AMIR	A	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	150.000,00€	- €	150.000,00€	- €	38.614,79€	- €	38.614,79€	- €	111.385,21 €	-74	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-2022RNHA0009. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDEETI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 2,1 M.NI)
85	2022RNHA0002	RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - SIS	A	Opere Pluricomunali	SIS	- €	600.000,00€	- €	600.000,00€	- €	1.385.097,29€	- €	1.385.097,29€	- €	785.097,29 €	130	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0002-2022RNHA0004-2022RNHA0006-2022RNHA0008-2022RNHA0010. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDEETI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 1,9 M.NI)
86	2020RNHA0006	Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema depurativo	D	Opere Pluricomunali	Gestore	9.590.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
87	2015RNHA0023	Telecontrollo e automazione imp. dep. RN	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	90.000,00€	- €	- €	90.000,00€	8.368,45€	- €	- €	8.368,45€	- 81.631,55 €	-90	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
88	2022RNHA0008	MANUT. STRA.IMP.FOGNATURA - RN - SIS	F	Opere Pluricomunali	SIS	- €	150.000,00€	- €	150.000,00€	- €	99.733,65€	- €	99.733,65€	- €	50.266,35 €	-33	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0002-2022RNHA0004-2022RNHA0006-2022RNHA0008-2022RNHA0010. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDEETI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 1,9 M.NI)
89	2014RNHA0017	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	300.000,00€	- €	- €	300.000,00€	643.787,45€	- €	- €	643.787,45€	343.787,45 €	114	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISITICO
90	2015RNHA0014	SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5	F	Pennabilli	Gestore	50.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
91	2017RNHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE PENNABILLI LOCALITA' PONTE MESSA	D	Pennabilli	Gestore	500.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
92	2015RNHA0015	ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-CAMAGRINO(N.9)	F	Poggio Torriana	Gestore	230.000,00€	- €	- €	- €	- €	2.370,73€	- €	- €	2.370,73€	2.370,73 €	100	SCOTAMENTO 2022 LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DELLA PREGETTAZIONE PRELIMINARE PREVISTA NEL 2023
93	2020RNHA0009	Ammodernamento e potenziamento impianto di Depurazione di Riccione	D	Riccione	Gestore	4.630.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
94	2017RNHA0017	ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA)	F	Riccione	Gestore	100.000,00€	5.000,00€	- €	- €	5.000,00€	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	DALLE VALUTAZIONI TECNICHE DEL GESTORE L' ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA IN QUESTIONE NON RISULTA PRESENTARE CRITICITA' DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE NE' RISULTA STRATEGICO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI INSISTE. SI IPOTIZZA DI AVVIARE L' INTERVENTO A PARTIRE DAL 2024
95	2014RNHA0048	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE	F	Riccione	Gestore	2.725.000,00 €	37.000,00€	- €	- €	37.000,00€	- €	- €	- €	- €	37.000,00 €	-100	NEL CORSO DEL 2018 E 2019 E' STATA EFFETTUATA L' ATTIVITA' DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI ALLACCI ALLA PUBBLICA FOGNATURA. COME DA ORDINANZE EMESSE DAL COMUNE DI RICCIONE. TALE ATTIVITA', ESSENDO STRETTAMENTE LEGATA ALLE TEMPSTICHE DELLE RISPOSTE DEI CITTADINI, AVEVA NEL POI UNA PIANIFICAZIONE DI LARGA MASSIMA NELLE VARIE ANNUALITA'. LO SCOSTAMENTO 2022 E' DOVUTO AL FATTO CHE L' INTERVENTO AL MOMENTO E' IN STATO SOSPESO IN QUANTO NON SONO STATE EMESSE NUOVE ORDINANZE DAL COMUNE DI RICCIONE
96	2017RNHA0015	ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI TRATTAMENTO ODORI DEL DEPURATORE DI RICCIONE	D	Riccione	Gestore	2.116.000,00 €	24.000,00€	- €	- €	24.000,00€	- €	- €	- €	- €	24.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
97	2022RNHA0014	INTERVENTI OTTIMIZZAZIONE RETICOLO FOGNARIO RICCIONE	F	Riccione	Gestore	1.950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
98	2017RNHA0018	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA	F	Riccione	Gestore	50.000,00€	20.000,00€	- €	- €	20.000,00€	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' ANCORA DA PROGETTARE E RIPIANIFICATO IN QUANTO DALLE VALUTAZIONI TECNICHE SVOLTE DAL GESTORE L' INTERVENTO NON RISULTA PRESENTARE CRITICITA' DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE. NON VIENE INFATTI INFICIATO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI INSISTE, NE' RISULTA STRATEGICO
99	2015RNHA0005	STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN. RIO DELL'ASSE	F	Riccione	Gestore	375.000,00 €	36.000,00€	- €	- €	36.000,00€	50.745,55€	- €	- €	50.745,55€	14.745,55 €	40	
100	2015RNHA0008	REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP. RICCIONE - II STRALCIO	D	Riccione	Gestore	1.945.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
101	2021RNHA0006	RICOSTRUZIONE PREMENTI SOLL. FUCINI	F	Riccione	Gestore	320.000,00 €	55.000,00€	- €	- €	55.000,00€	2.487,37€	- €	- €	2.487,37€	- 52.512,63 €	-95	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLE PROBLEMATICHE AVUTE CON COMUNE E LOTTIZZANTE SULL'INDIVIDUAZIONE DEI TRACCIATI NECESSARI ALLA POSA DELLE TUBAZIONI
102	2021RNHA0005	REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMINAZIONE DEL DEPURATORE DI RICCIONE	D	Riccione	Gestore	3.360.000,00 €	30.000,00€	- €	- €	30.000,00€	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
103	2017RNHA0019	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SARDEGNA E VIA CAGLIARI	F	Riccione	Gestore	90.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
104	2014RNHA0058	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA	F	Rimini	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
105	2019RNHA0001	PSB-Separazione reti FOG-Nord RN-II* Stralcio (Lotto3)	F	Rimini	AMIR	6.098.840,00 €	1.411.000,00€	- €	1.411.000,00€	- €	924.583,69€	- €	924.583,69€	- €	486.416,31 €	-34	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2022 E' CONSEGUENTE ALLO SLITTAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AVVIO LAVORI DOVUTO ALLA SVILUPPI PROGETTUALI ANCORA IN CORSO RELATIVI ALLA NECESSITA' DI DEFINIRE VARIANTI PER RICONTRIO LIVELLO DI FALDA FREATICA A QUOTA DIFFERENTE RISPETTO AL PROGETTO CON LA CONSEGUENTE MODIFICA DEL PROGETTO STRUTTURALE DELLA VASCA DEL SOLLEVAMENTO BRANCONA E ALLA RIDEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI POSA DELLA RETE SU VIA DOMENICONI PER PRESCRIZIONI RFI E LA NECESSITA' DI RIDURRE L' UTILIZZO DEL WELLPOINT E DI ATTRAVERSAMENTO RFI PER MICROPALI NON SEGNALATI IN FASE AUTORIZZATIVA. SI PREVEDE IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE NEL COMPLESSO, A MENO DELLE ATTIVITA' DI RIPRISTINO VIABILITA', ENTRO PRIMA PARTE DEL 2025



Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Rimini n.12 del 26 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
106	2014RNHA0067	PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (Piazzale Kennedy)	F	Rimini	Gestore	30.770.571,00 €	234.000,00 €	2.858.000,00 €	- €	2.624.000,00 €	- €	- €	- €	- €	234.000,00 €	-100	INTERVENTO TERMINATO. LO SCOSTAMENTO 2022 E' DOVUTO ALLO SLITTAMENTO DELL' INCASSO DEL CONTRIBUTO (RENDICONTAZIONE FINALE INVIATA IL 16/06/2021 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI COMPLETATE NEL FEBBRAIO 2022).
107	2015RNHA0002	PSB - RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE	D	Rimini	Romagna Acque	7.217.948,00 €	900.000,00 €	- €	900.000,00 €	- €	363.772,96 €	- €	363.772,96 €	- €	536.227,04 €	-59	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' IMPOSSIBILITA' DI COMPLETARE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' AREA IMPIANTISTICA PER LA DIFFICOLTA' DI TROVARE UN ACCORDO CON IL COMUNE DI RIMINI PER LA NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AREA.
108	2022RNHA0016	POTENZIAMENTO SVUOTAMENTO P.LE KENNEDY	F	Rimini	Gestore	913.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
109	2014RNHA0066	PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA	F	Rimini	Gestore	8.546.721,00 €	1.093.000,00 €	- €	- €	1.093.000,00 €	925.408,16 €	- €	- €	925.408,16 €	167.591,84 €	-15	
110	2014RNHA0059	PSB - REALIZZAZIONE DORSALE SUD RN - PREMENTE (+condotta soll. 2B)	F	Rimini	Romagna Acque	12.958.239,00 €	1.807.000,00 €	- €	1.807.000,00 €	- €	831.181,13 €	- €	831.181,13 €	- €	975.818,87 €	-54	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLE DIVERSE TEMPISTICHE DELL' ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE. LAVORI TERMINATI
111	2020RNHA0001	PSB - COLLEGAMENTO VASCHE COLONNELLA I E COLONNELLA II	F	Rimini	Gestore	6.547.120,00 €	127.000,00 €	- €	- €	127.000,00 €	197.505,71 €	- €	- €	197.505,71 €	70.505,71 €	55	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FLUSSO CONTABILE DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI
112	2022RNHA0015	RIFACIMENTO PREMENTE 1B	F	Rimini	Gestore	602.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	RITARDO AVVIO PROGETTAZIONE DOVUTO ALLA NECESSITA' DI AVVIARE INDAGINI PRELIMINARI APPROFONDITE RELATIVE AI SOTTOSERVIZI ESISTENTI. INOLTRE SONO SORTI PROBLEMATICHIE CON RFI PER LA COMPETENZA DELLA REALIZZAZIONE DELLA GUAINA IN ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA
113	2017RNHA0021	SOSTITUZIONE PERIODICA SISTEMA DI FILTRI A MEMBRANA DEL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA	D	Rimini	Gestore	6.000.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	-100	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI SONO DI MASSIMA. NEL 2022 NON E' STATO NECESSARIO EFFETTUARE LA SOSTITUZIONI DI MEMBRANE
114	2014RNHA0072	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO	F	Rimini	Gestore	2.873.000,00 €	- €	986.000,00 €	- €	986.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. DA COMPLETARE LE ATTIVITA' CONTABILI IN RELAZIONE ALL' INCASSO DEL CONTRIBUTO
115	2015RNHA0017	SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI	F	Rimini	Gestore	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE DALLA NORMATIVA SCARICHI REGIONALE IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO MINORE 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PROGETTAZIONE
116	2022RNHA0017	ADEGUAMENTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ISA	F	Rimini	Gestore	1.949.000,00 €	127.000,00 €	- €	- €	127.000,00 €	142.611,51 €	- €	- €	142.611,51 €	15.611,51 €	12	
117	2017RNHA0023	INTERVENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA FOSSA PATARA	F	Rimini	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
118	2022RNHA0022	RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(7° LOTTO)	A	Rimini	Gestore	574.000,00 €	333.000,00 €	- €	- €	333.000,00 €	89.787,37 €	- €	- €	89.787,37 €	243.212,63 €	-73	INTERVENTI DI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE CONTESTUALI AGLI INTERVENTI DI FOGNATURA DI CUI ID 2014RNHA0063. INTERVENTO IN ESECUZIONE DA FINE 2022 LEGATO ALL' AVANZAMENTO DEL CONTIERE FOGNATURA.
119	2021RNHA0013	SEPARAZIONE RETI VILLAGGIO 1° MAGGIO	F	Rimini	Gestore	2.380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
120	2021RNHA0004	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	F	Rimini	Gestore	37.903.417,00 €	414.000,00 €	- €	- €	414.000,00 €	- €	- €	- €	- €	414.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
121	2014RNHA0049	RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO COVIGNANO	A	Rimini	Romagna Acque	3.361.625,00 €	692.000,00 €	- €	692.000,00 €	- €	634.777,48 €	- €	634.777,48 €	- €	57.222,52 €	-8	
122	2018RNHA0003	Manutenzione straordinaria Sollevamento 1B	F	Rimini	Gestore	1.650.000,00 €	193.000,00 €	- €	- €	193.000,00 €	476.916,54 €	- €	- €	476.916,54 €	283.916,54 €	147	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI.
123	2014RNHA0063	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - II Stralcio (Lotti 1-2-4-5-6-7)	F	Rimini	Gestore	15.244.000,00 €	2.003.000,00 €	- €	- €	2.003.000,00 €	1.349.663,94 €	- €	- €	1.349.663,94 €	653.336,06 €	-32	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AVANZAMENTO PROGETTUALE/CANTIERISTICO DEI VARI LOTTI CHE COMPONGONO QUESTO ID. LOTTI 1 E 2 COMPLETATI, LOTTI 4 E 7 IN ESECUZIONE LAVORI, LOTTI 5 E 6 IN PROGETTAZIONE
124	2022RNHA0013	INTERVENTO RETICOLO SECONDARIO SALVAGUARDIA IDRAULICA	F	Rimini	Gestore	11.300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
125	2014RNHA0053	ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOGGIA	F	Rimini	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
126	2022RNHA0025	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA RIMINI (SFAM 14)	F	Rimini	Gestore	2.950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
127	2014RNHA0073	PSB-INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO DI RIMINI - DORSALE AUSA	F	Rimini	Gestore	9.734.797,00 €	341.500,00 €	- €	- €	341.500,00 €	300.638,53 €	- €	- €	300.638,53 €	40.861,47 €	-11	
128	2017RNHA0022	COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD (EX INTERVENTO RICOSTR. PREMENTE DN 700 V.FLAMINIA-V.FADA)	F	Rimini	AMIR	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID ANNULLATO
129	2020RNHA0012	COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD	F	Rimini	Gestore	1.038.000,00 €	55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	55.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' IN CORSO DI INQUADRAMENTO DI TUTTO IL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SUD DI RIMINI E RELATIVO FUNZIONAMENTO POST INTERVENTI IN FASE DI CONCLUSIONE
130	2014RNHA0064	PSB-REALIZ. VASCA LAMINAZIONE OSPEDALE (Colonnella I)	F	Rimini	Gestore	2.538.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
131	2014RNHA0069	NUOVO SCOLMATORE MAVONE V.COVIGNANO RN	F	Rimini	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
132	2014RNHA0068	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	F	Rimini	Gestore	46.344.218,00 €	364.000,00 €	- €	- €	364.000,00 €	524.579,70 €	- €	- €	524.579,70 €	160.579,70 €	44	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FLUSSO CONTABILE DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI
133	2021RNHA0012	REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA	F	Rimini	Gestore	2.880.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	POSTICIPAZIONE DELL'AVVIO DELL'INTERVENTO DOVUTO AD ESITO FAVOREVOLE DELLE INDAGINI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE CONDOTTE
134	2014RNHA0070	ADEG RETE FOG V.S.CHIARA-VICOLO CIMA RN	F	Rimini	Gestore	620.000,00 €	22.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €	6.085,53 €	- €	- €	6.085,53 €	15.914,47 €	-72	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL FATTO CHE GLI IMPORTI IPOTIZZATI PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI SONO STATI INFERIORI A QUANTO IPOTIZZATO
135	2014RNHA0052	PSB - RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA	D	Rimini	Romagna Acque	28.034.725,00 €	433.000,00 €	- €	433.000,00 €	- €	230.863,35 €	- €	230.863,35 €	- €	202.136,65 €	-46	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLE DIVERSE TEMPISTICHE DELL' ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE. LAVORI TERMINATI
136	2023RNHA0001	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA	D	Rimini	Gestore	2.658.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
137	2022RNHA0036	RINNOVO RETI ACQUEDOTTO ZONA RIMINI NORD II STRALCIO (LOTTO 3)	A	Rimini	Gestore	1.005.022,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
138	2022RNHA0012	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA	F	Rimini	Gestore	305.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	36.000,00 €	-100	INTERVENTO AVVIATO NEL 2023. PREVISTA CONCLUSIONE NEL 2024 COME DA PROGRAMMAZIONE PREVISTA A PO
139	2014RNHA0065	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN I STRALCIO	F	Rimini	Gestore	2.444.000,00 €	- €	1.885.000,00 €	- €	1.885.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. DA COMPLETARE LE ATTIVITA' CONTABILI IN RELAZIONE ALL' INCASSO DEL CONTRIBUTO
140	2014RNHA0062	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - I Stralcio I Lotto	F	Rimini	Gestore	2.073.000,00 €	236.000,00 €	- €	- €	236.000,00 €	137.759,23 €	- €	- €	137.759,23 €	98.240,77 €	-41	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' AVANZAMENTO DEL CANTIERE

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Rimini n.12 del 26 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
141	2021RNHA0014	REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E CAMBIATORI DI CALORE - DEP. S. GIUSTINA	D	Rimini	Gestore	350.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
142	2022RNHA0018	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO GROTTAROSSA	F	Rimini	Gestore	1.632.000,00€	20.000,00€	- €	- €	20.000,00€	156.356,66€	- €	- €	156.356,66€	136.356,66€	681	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL MAGGIOR AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI RISPETTO AGLI IMPORTI PREVISTI A POI
143	2014RNHA0055	PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA	F	Rimini	Romagna Acque	20.142.000,00€	1.627.000,00€	- €	1.627.000,00€	- €	1.473.427,45€	- €	1.473.427,45€	- €	153.572,55€	-9	
144	2014RNHA0045	COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICO 18 CON NUOVO DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - STRALCIO FOGNATURA	F	Saludecio	AMIR	250.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
145	2015RNHA0019	ADEG. SCARICO(4.18) - STRALCIO ACQUEDOTTO V.MONTE DEL PRETE BASSO	A	Saludecio	AMIR	50.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
146	2022RNHA0032	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN CLEMENTE (SFAM 501 BIS)	F	San Clemente	Gestore	300.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
147	2022RNHA0033	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN GIOVANNI (SFAM 1)	F	San Giovanni in Marignano	Gestore	5.500.000,00€	50.000,00€	- €	- €	50.000,00€	- €	- €	- €	- €	50.000,00€	-100	RIPIANIFICAZIONE LEGATA ALLO SVILUPPO DI APPROFONDIMENTI PER SOLUZIONI ALTERNATIVE / MIGLIORATIVE RELATIVE ALL' ABBATTIMENTO DEI CARICHI
148	2018RNHA0006	Realizzazione di nuova rete idrica di connessione Siepi-Pianacci - FSC	A	San Leo	Gestore	240.000,00€	130.000,00€	- €	- €	130.000,00€	195.875,22€	- €	- €	195.875,22€	65.875,22€	50	INTERVENTO COMPLETATO TECNICAMENTE A GENNAIO 2023. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE NELLE PASSATE ANUALITA'. IN CORSO ITER PER RECUPERO CONTRIBUTO
149	2015RNHA0018	ADEGUAMENTO SCARICO N. 5 TORELLO EST (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	F	San Leo	Gestore	50.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
150	2017RNHA0025	ADEGUAMENTO DEPURATORE CA'BALDONE S.AGATA FELTRIA (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	D	Sant'Agata Feltria	Gestore	300.000,00€	10.000,00€	- €	- €	10.000,00€	711,44€	- €	- €	711,44€	9.288,56€	-92	
151	2018RNHA0009	Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini - FSC	A	Santarcangelo di Romagna	Gestore	120.000,00€	90.000,00€	- €	- €	90.000,00€	78.519,72€	- €	- €	78.519,72€	11.480,28€	-12	
152	2014RNHA0078	ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE	F	Santarcangelo di Romagna	Gestore	1.744.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
153	2018RNHA0010	Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona - FSC	A	Santarcangelo di Romagna	Gestore	190.000,00€	150.000,00€	- €	- €	150.000,00€	120.085,68€	- €	- €	120.085,68€	29.914,32€	-19	INTERVENTO IN CORSO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE DI POI. SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO CONTABILE
154	2014RNHA0075	POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO	A	Santarcangelo di Romagna	Romagna Acque	2.048.657,00€	598.000,00€	- €	598.000,00€	- €	601.994,02€	- €	601.994,02€	- €	3.994,02€	0	
155	2014RNHA0076	ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA PACE	F	Santarcangelo di Romagna	Gestore	506.641,00€	219.000,00€	- €	- €	219.000,00€	11.193,59€	- €	- €	11.193,59€	207.806,41€	-94	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALL' ALLUNGAMENTO DELLE TEMPISTICHE DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E CONSEGUENTE AVVIO DEI LAVORI
156	2017RNHA0026	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIE PELLICO, BRUXELLES	F	Santarcangelo di Romagna	Gestore	100.000,00€	30.000,00€	- €	- €	30.000,00€	- €	- €	- €	- €	30.000,00€	-100	SCOSTAMENTO 2022 CONSEGUENTE AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' IN SOSPESA PROGETTAZIONE IN QUANTO LEGATO ALL' ATTIVITA' DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SULLA VIA PELLICO DA PARTE DEL COMUNE CHE ATTUALMENTE E' IN STATO SOSPESO. INOLTRE OCCORRE PRIMA LA FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO BONARIO E SERVITU'. AL MOMENTO NON SUSSISTONO CRITICITA'
157	2017RNHA0028	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.ARCANGELO	F	Santarcangelo di Romagna	Gestore	797.000,00€	65.000,00€	- €	- €	65.000,00€	12.828,05€	- €	- €	12.828,05€	52.171,95€	-80	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALL' ALLUNGAMENTO DEI TEMPI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEGLI ACCORDI BONARI DA PARTE DEI PROPRIETARI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI.
158	2018RNHA0001	RISANAMENTO SCARICHI 9, 10 E 11	F	Verucchio	AMIR	234.709,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	ID TERMINATO
159	2018RNHA0007	Rinnovo rete idrica località Fontana - Monte Ugone - FSC	A	Verucchio	Gestore	180.000,00€	150.000,00€	- €	- €	150.000,00€	283.906,89€	- €	- €	283.906,89€	133.906,89€	89	INTERVENTO COMPLETATO TECNICAMENTE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE NELLE PASSATE ANUALITA'. IN CORSO ITER PER RECUPERO CONTRIBUTO
<b>Totale</b>							<b>30.948.201,00€</b>	<b>7.002.000,00€</b>	<b>12.260.000,00€</b>	<b>11.686.201,00€</b>	<b>29.274.847,20€</b>	<b>1.828.721,83€</b>	<b>9.425.631,90€</b>	<b>18.020.493,47€</b>	<b>1.673.353,80€</b>		

	Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
<b>Importo Totale</b>	30.948.201,00	7.002.000,00	12.260.000,00	11.686.201,00	29.274.847,20	1.828.721,83	9.425.631,90	18.020.493,47	<b>100,4%</b>
<b>Importo Totale - esclusi investimenti di struttura</b>	29.165.653,00	7.002.000,00	12.260.000,00	9.903.653,00	29.274.847,20	1.828.721,83	9.425.631,90	18.020.493,47	

Legenda: A = acquedotto D = depurazione  
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti  
ST=struttura

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore  
F.to Daniele Morelli

Il segretario verbalizzante  
F.to Marialuisa Campani

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Vito Belladonna

Bologna, 29 gennaio 2024
